




सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय
डोटी


दोश्रो चौमासिक प्रगति समिक्षा ०७९/८०

स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिमको योजनाहरु

- सिंचाई योजना संख्या : २६७
- नदि नियन्त्रण योजना संख्या : ११०
- जम्मा योजना संख्या : ३७७

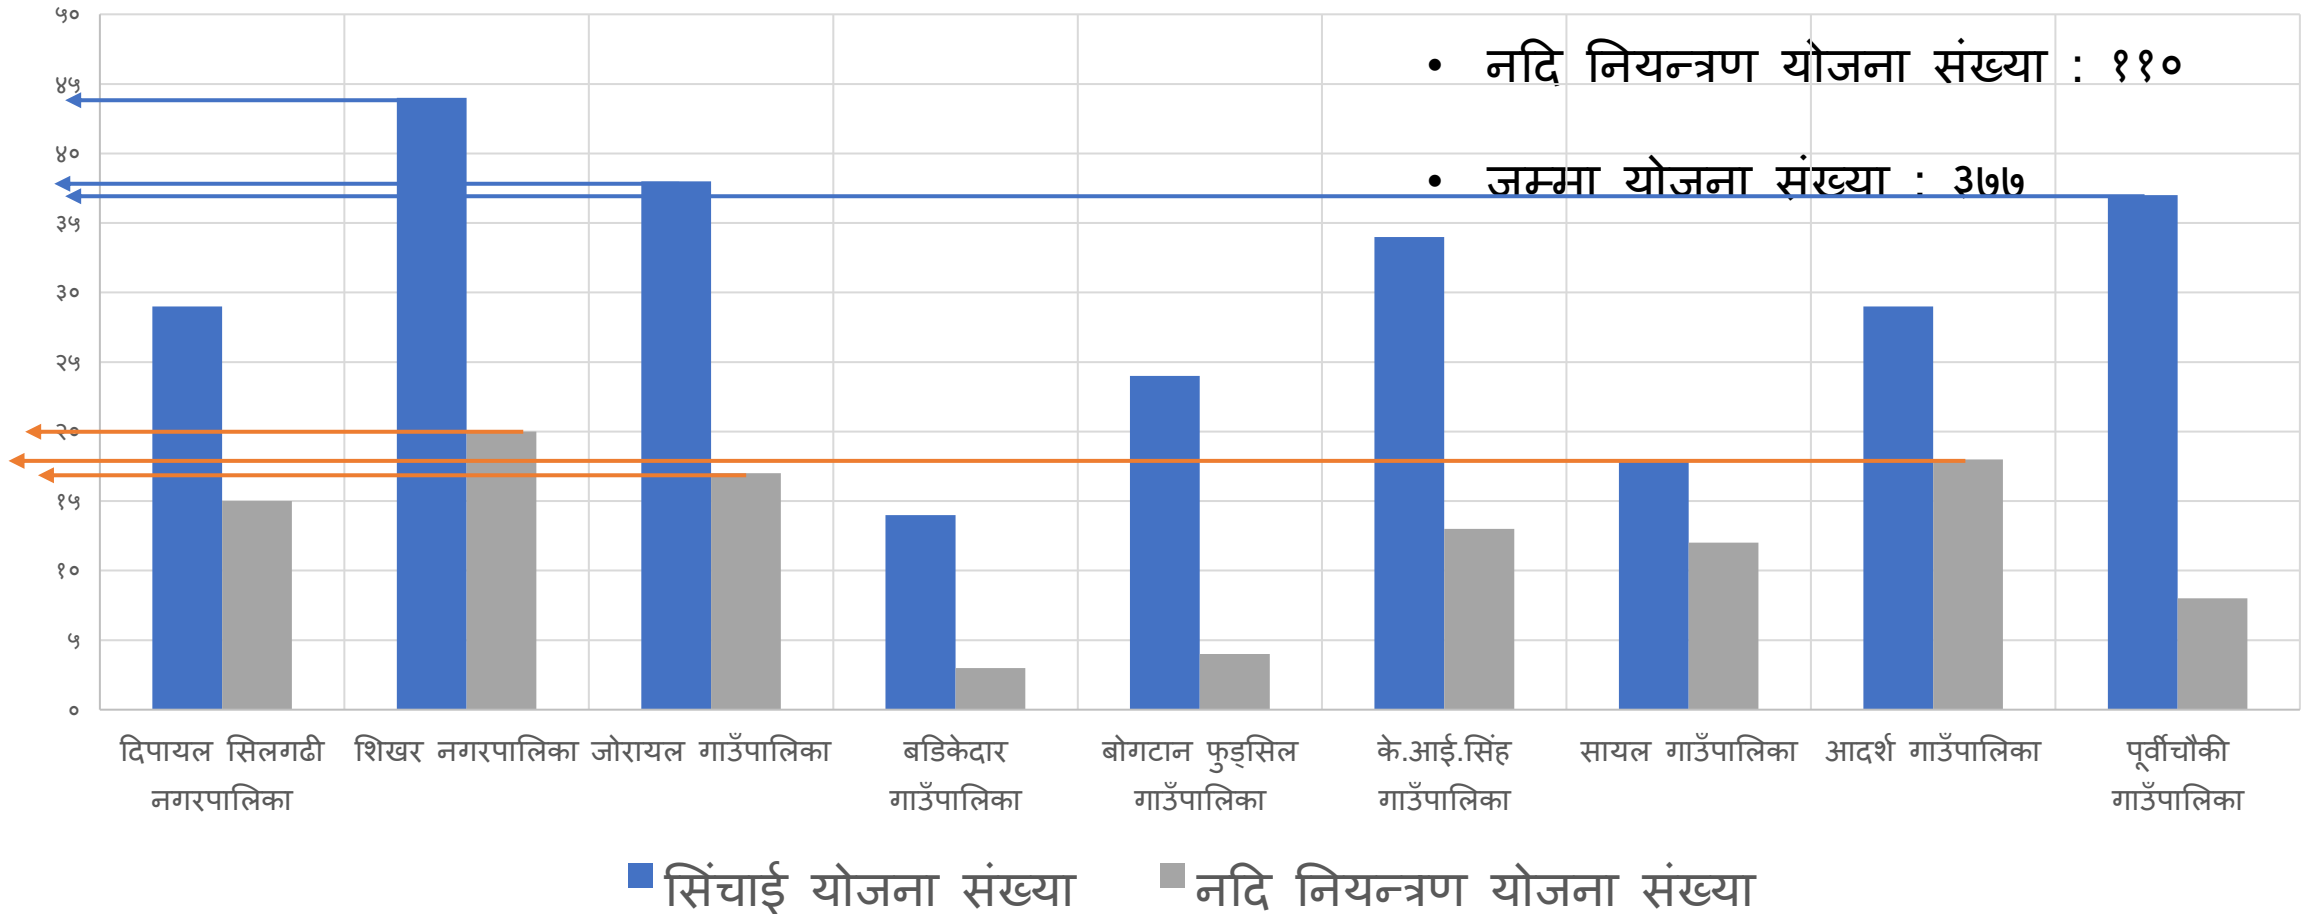

सिंचाई योजनाहरू

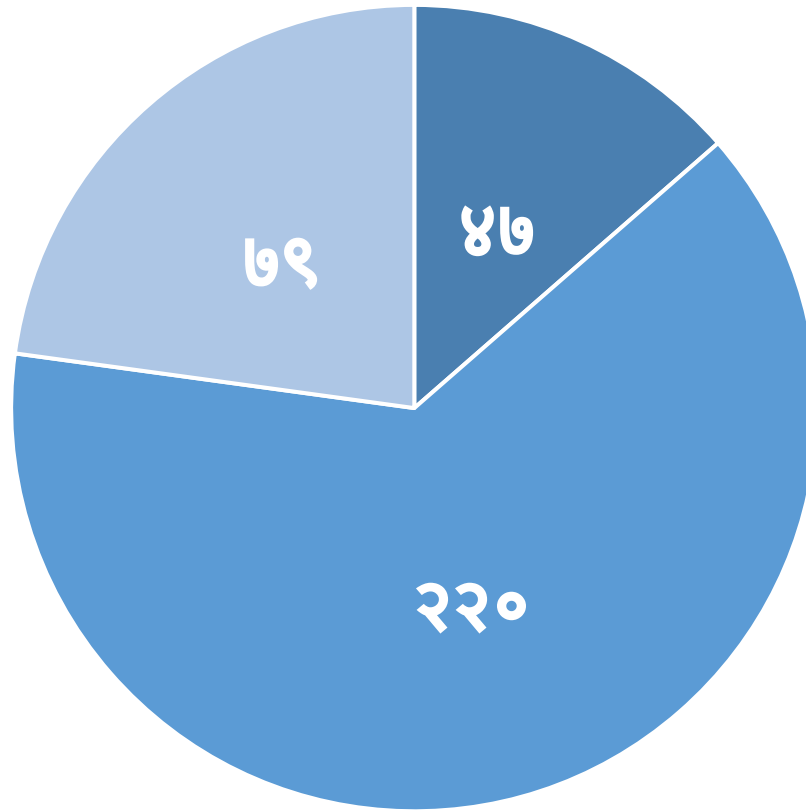


- सम्झौता हुन बाकी योजना : १८ %
- सम्झौता भइ निर्माणको चरणमा रहेको : ८२%
- निर्माण सम्पन्न योजना : ३६%

■ सम्झौता हुन बाकी योजना संख्या ■ सम्झौता भएको योजना संख्या ■ निर्माण सम्पन्न योजना


सिंचाई योजनाहरूका उपलब्धि

सिंचाई क्षेत्र फल (हे)

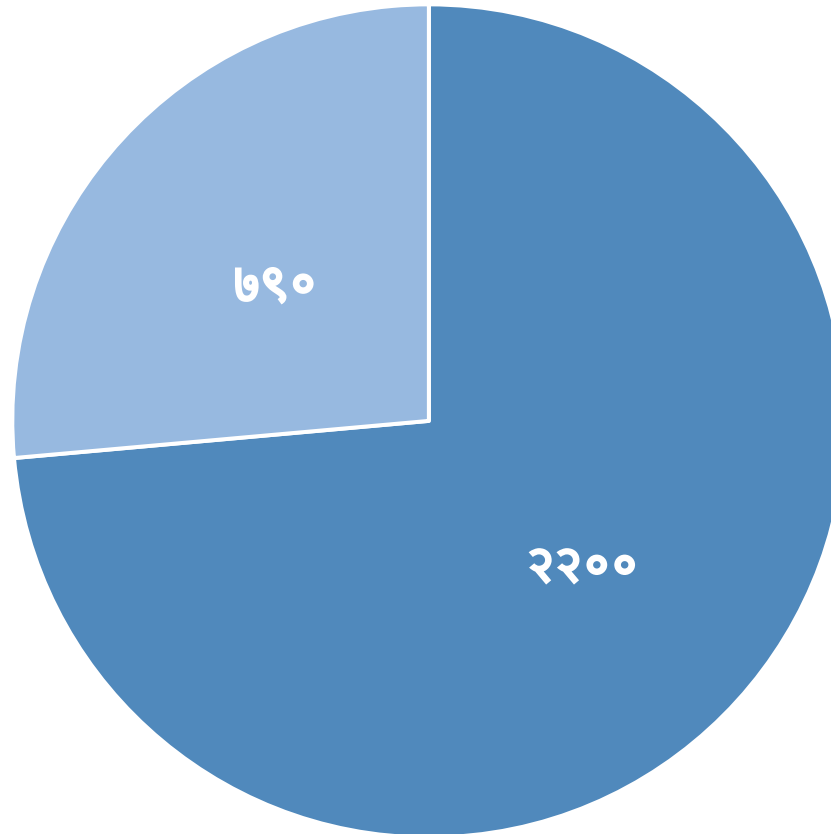

- सम्झौता भएको योजना संख्या
- निर्माण सम्पन्न योजना

नदि नियन्त्रण योजनाहरू

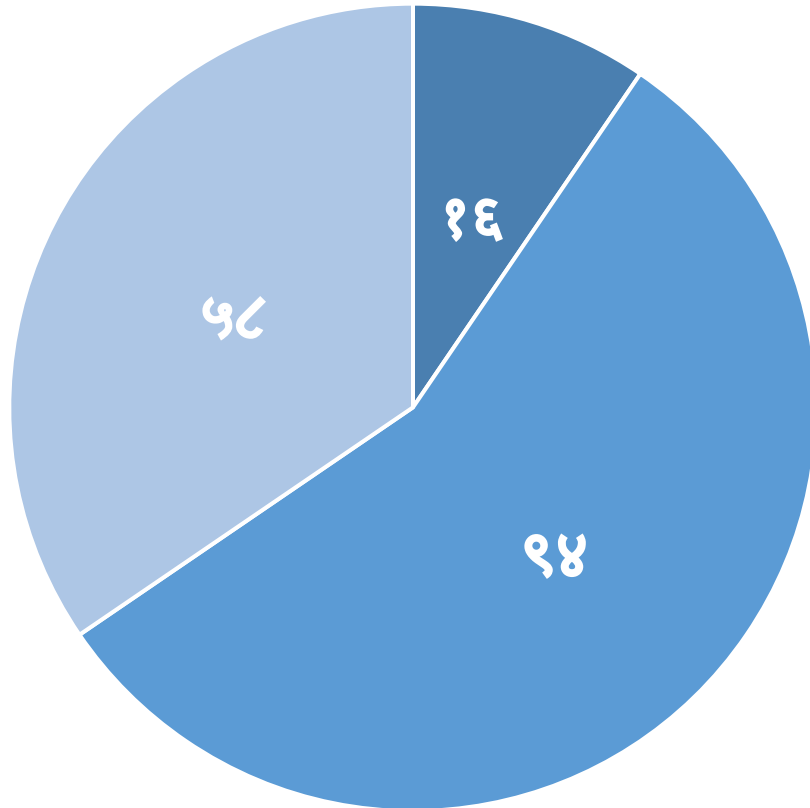

- सम्झौता हुन बाकी योजना : १९ %
- सम्झौता भइ निर्माणको चरणमा रहेको : ४९%
- निर्माण सम्पन्न योजना : ६२%

■ सम्झौता हुनबाकी योजना संख्या ■ सम्झौता भएको योजना संख्या ■ निर्माण सम्पन्न योजना


नदि नियन्त्रण अन्तर्गत भएका कार्य

मिटरमा



- सम्झौता हुनबाकी योजना संख्या
- सम्झौता भएको योजना संख्या
- निर्माण सम्पन्न योजना

नदि नियन्त्रण अन्तर्गत भएका कार्य

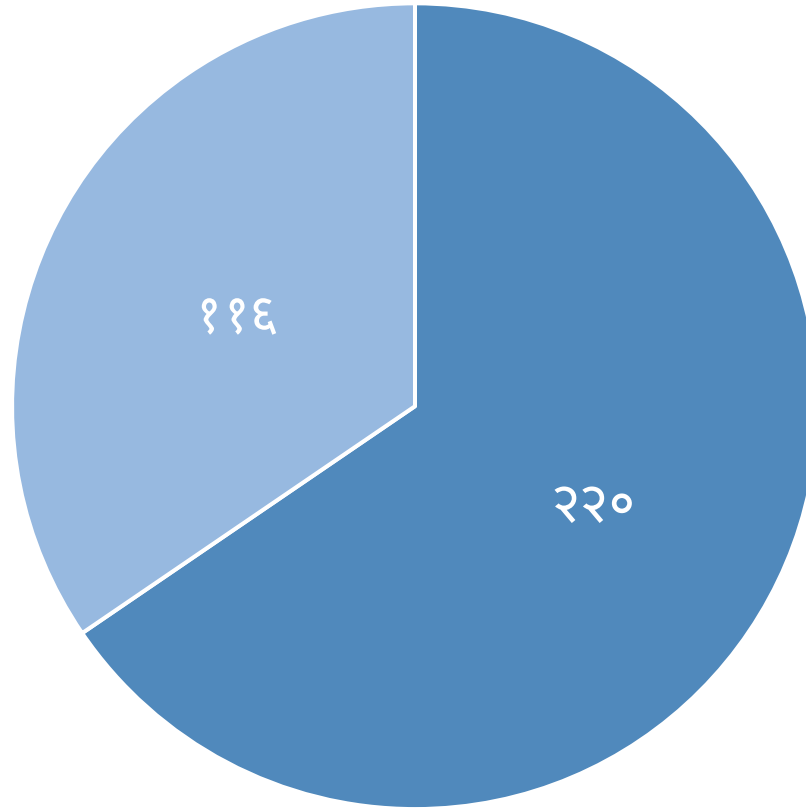


■ यस आ.ब.जल उत्पन्न प्रकोपबाट सम्मक्षण हुने जमिन (हे)

■ सम्मक्षित जमिन (हे)

निर्माण सम्पन्न योजनाहरूको विवरण

- निर्मित सिंचाई योजना संख्या : ७९
- निर्मित नदि नियन्त्रण योजना संख्या : ५८
- जम्मा निर्मित योजना संख्या : १३७

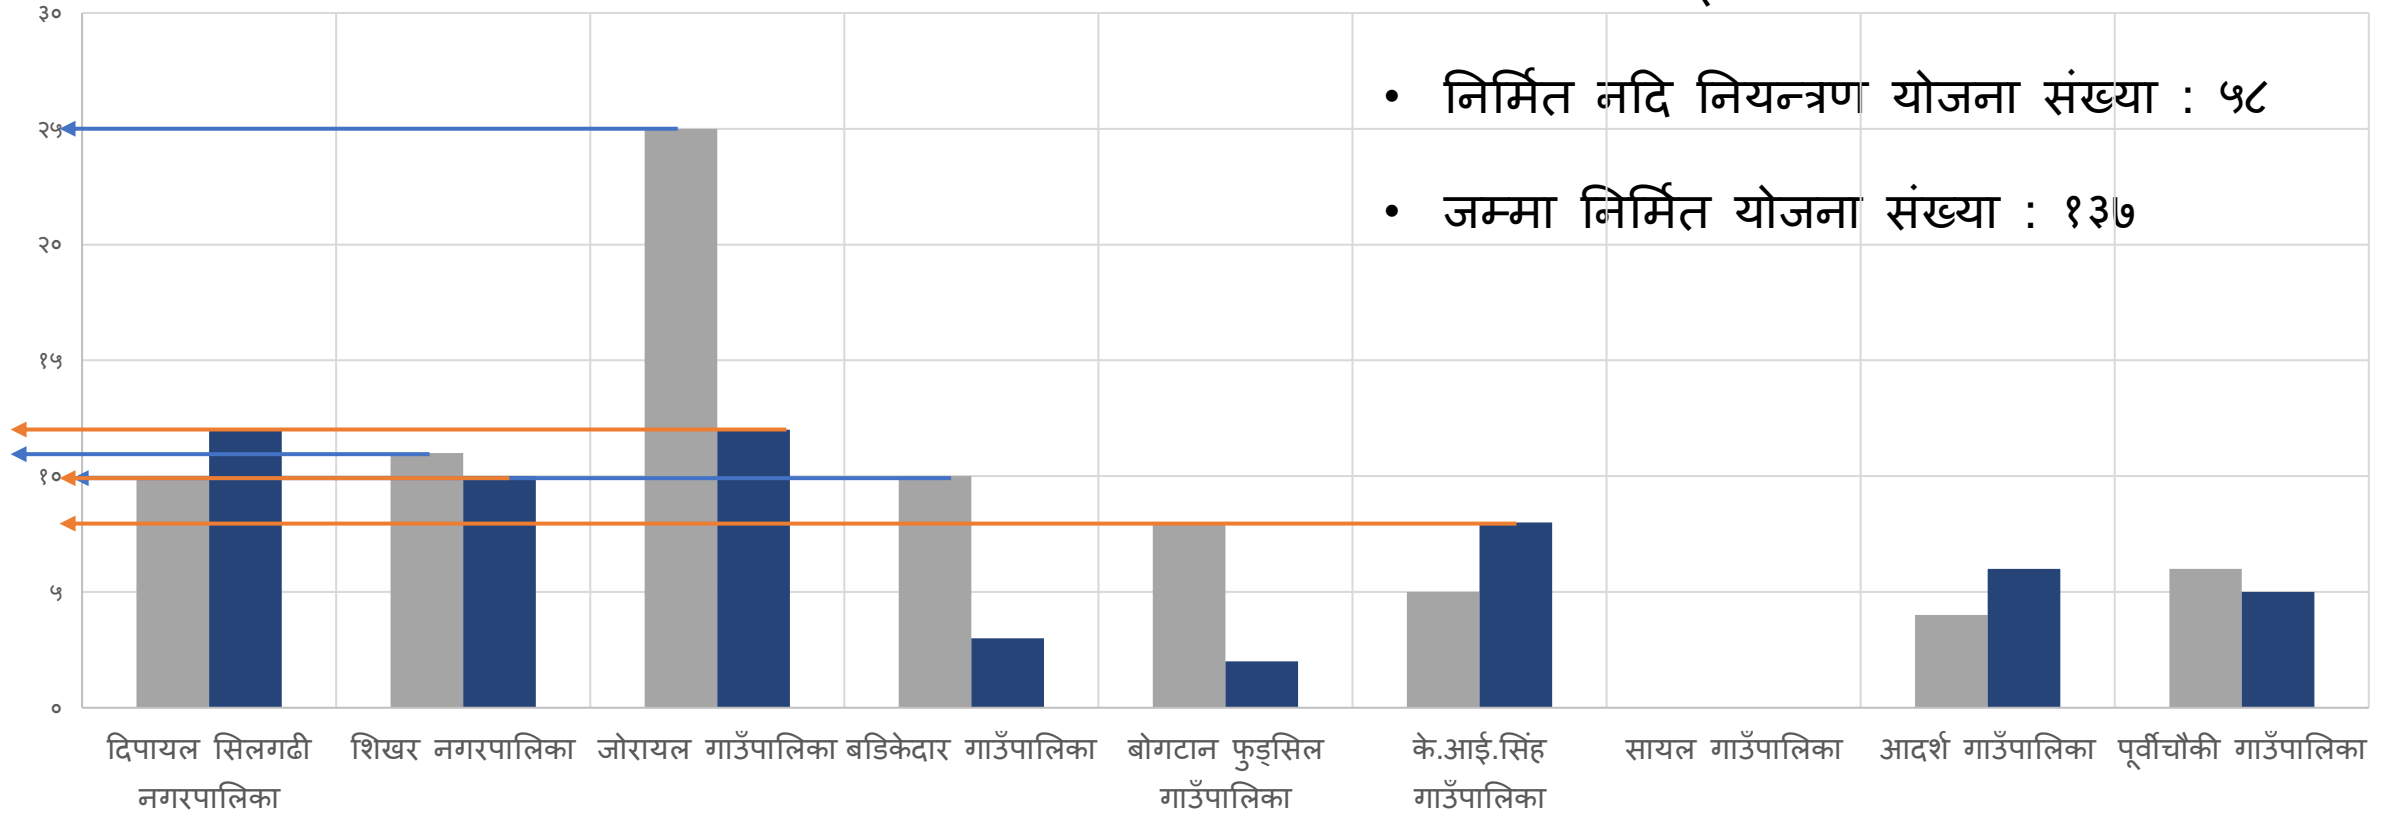


■ निर्माण सम्पन्न सिंचाई योजना संख्या


■ निर्माण सम्पन्न नदि नियन्त्रण योजना संख्या

योजना समझौता ट्रेन्ड


योजना समझौता संख्या

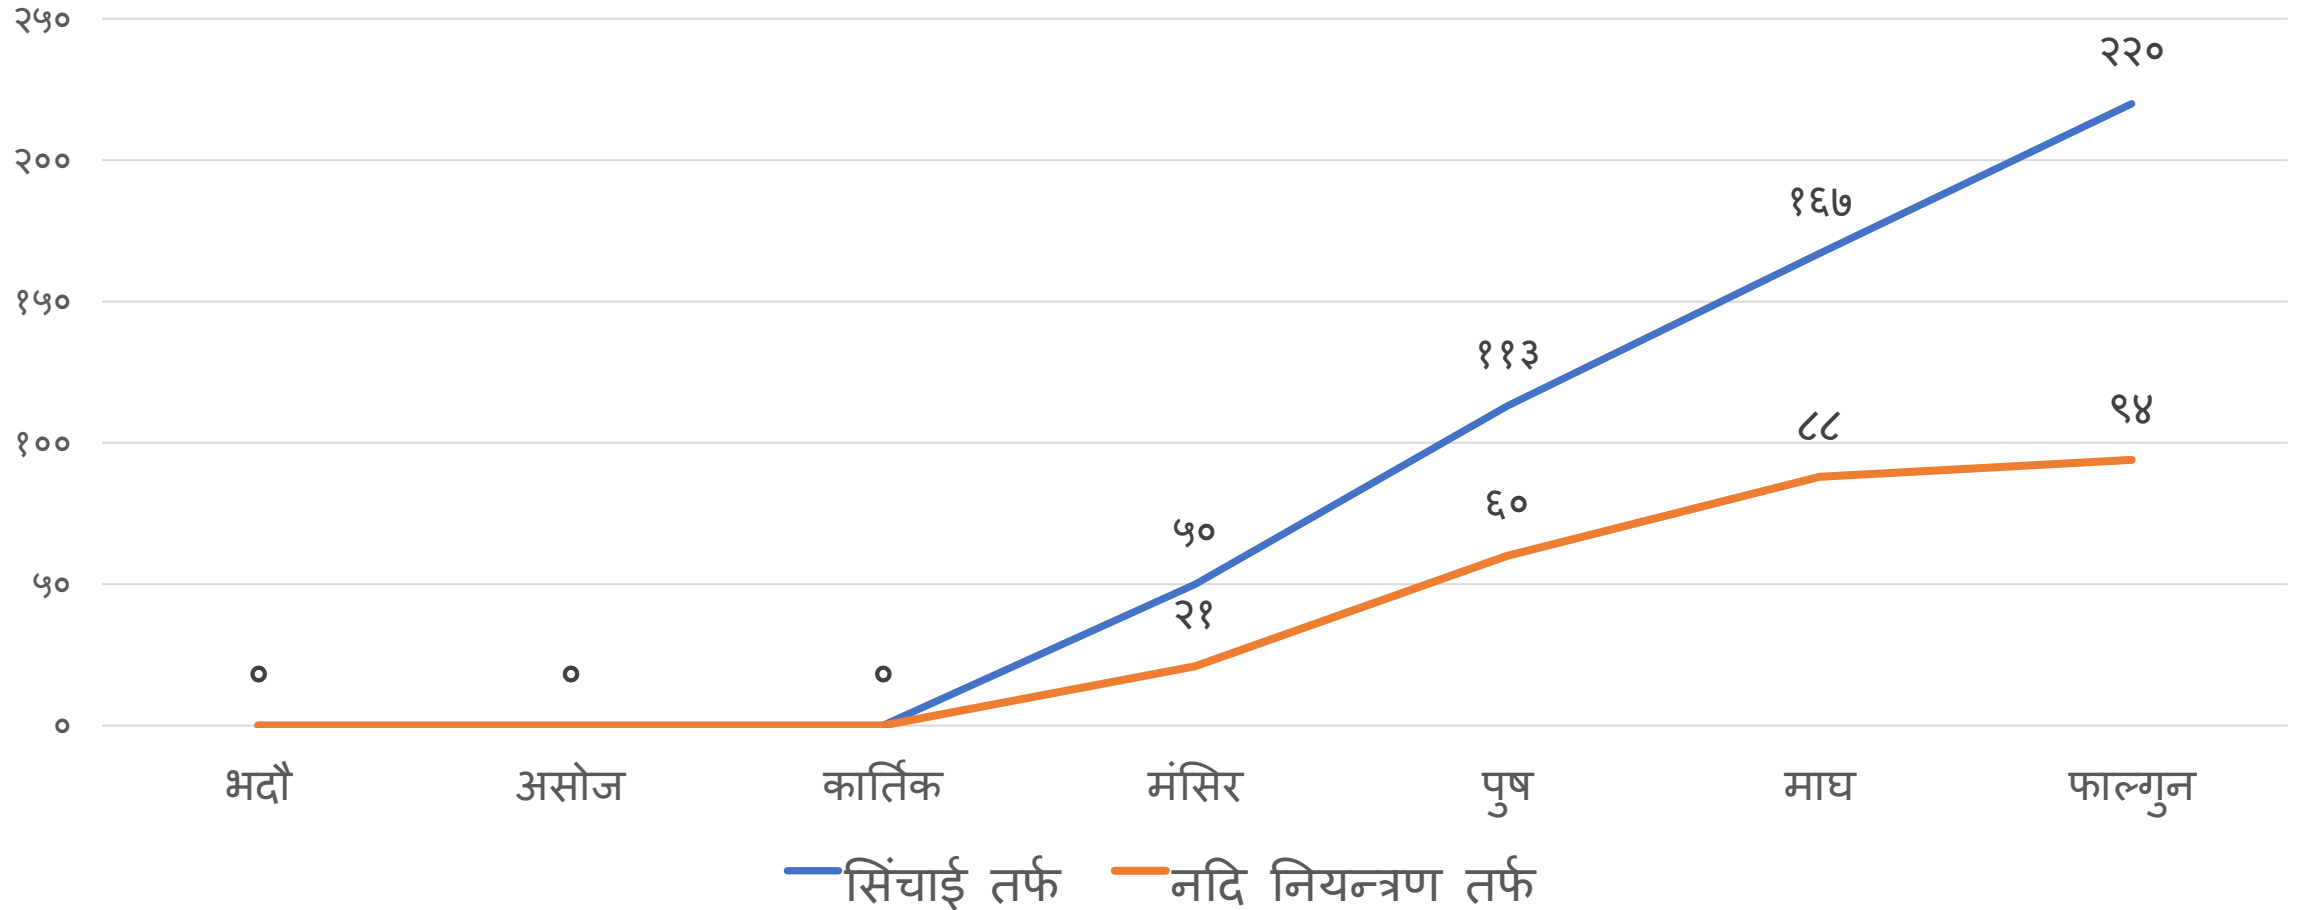


योजना निर्माण ट्रेन्ड

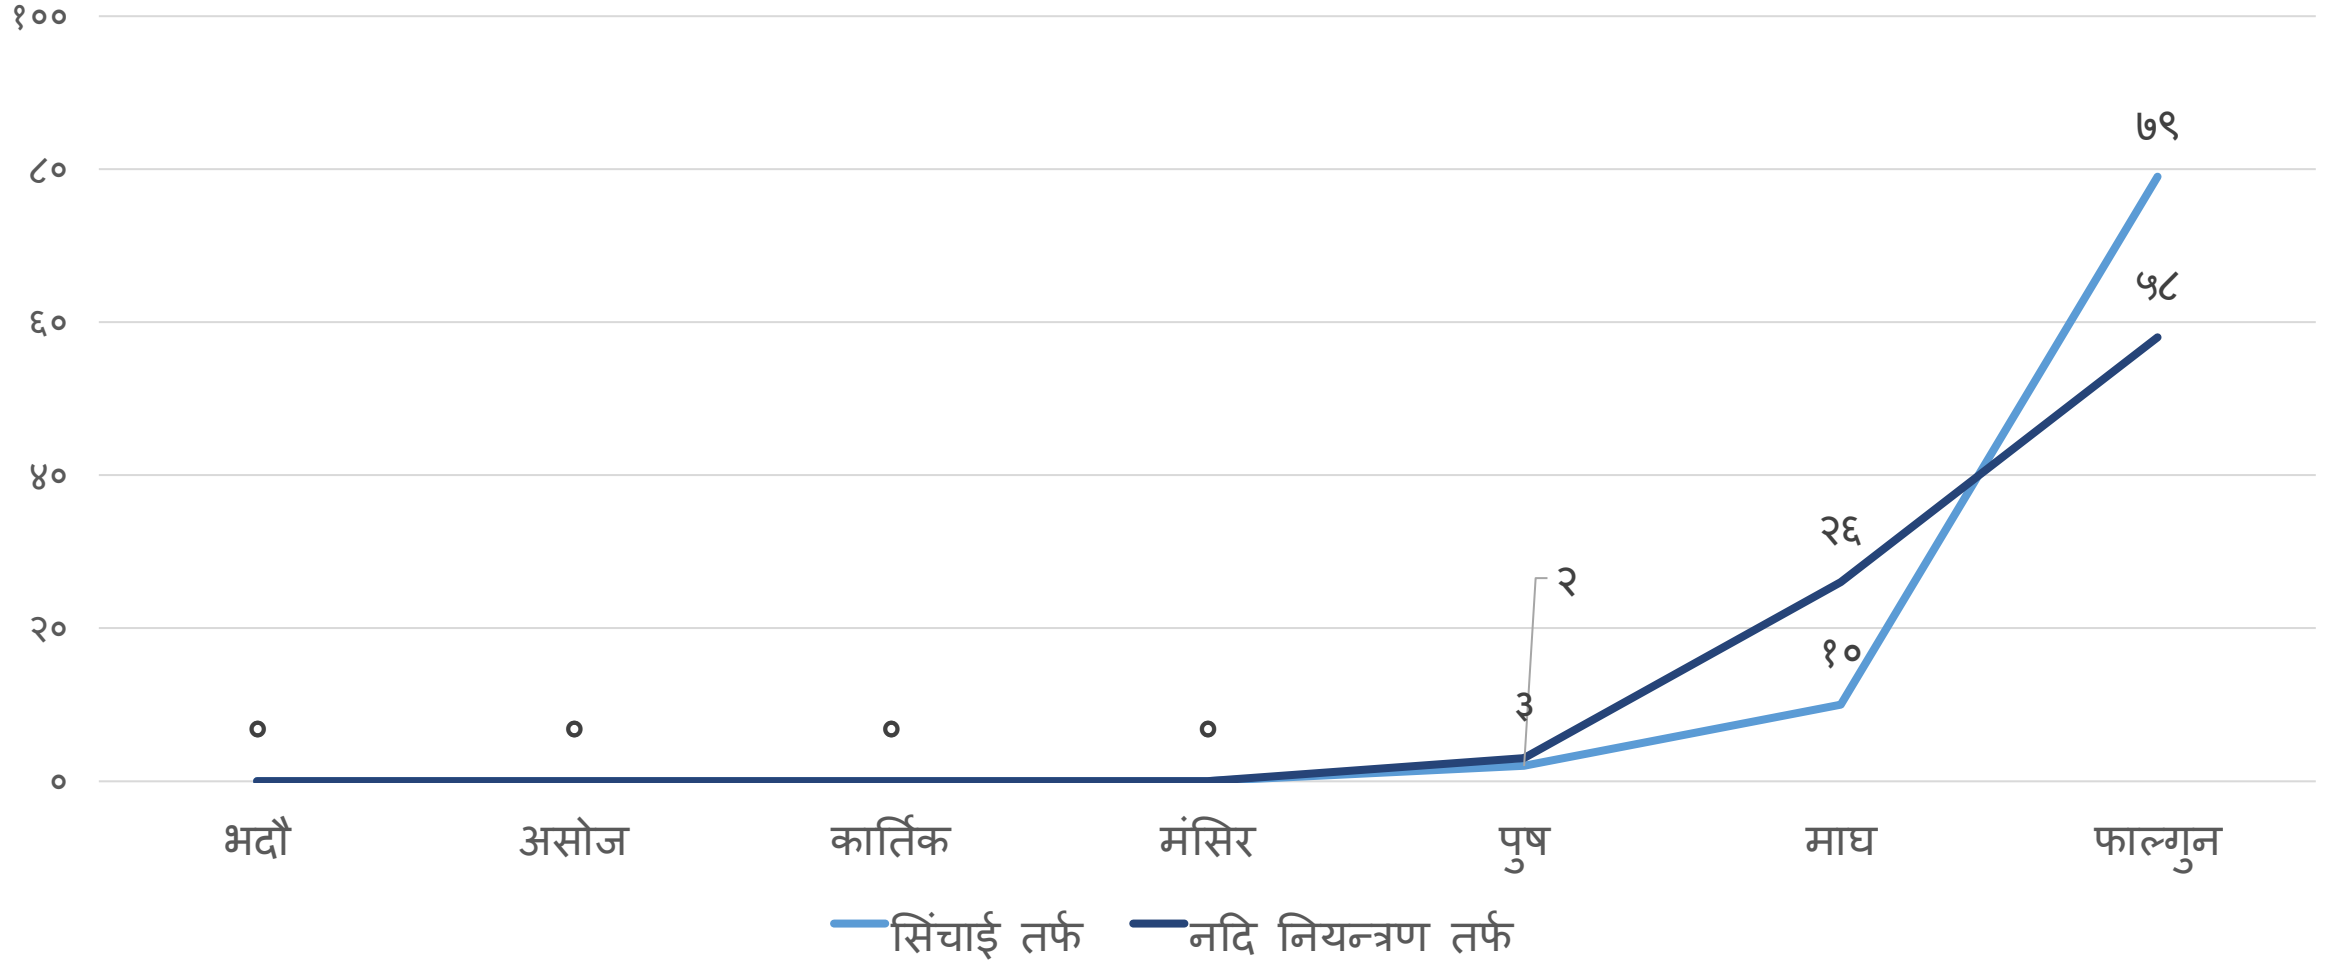

योजना निर्माण ट्रेन्ड

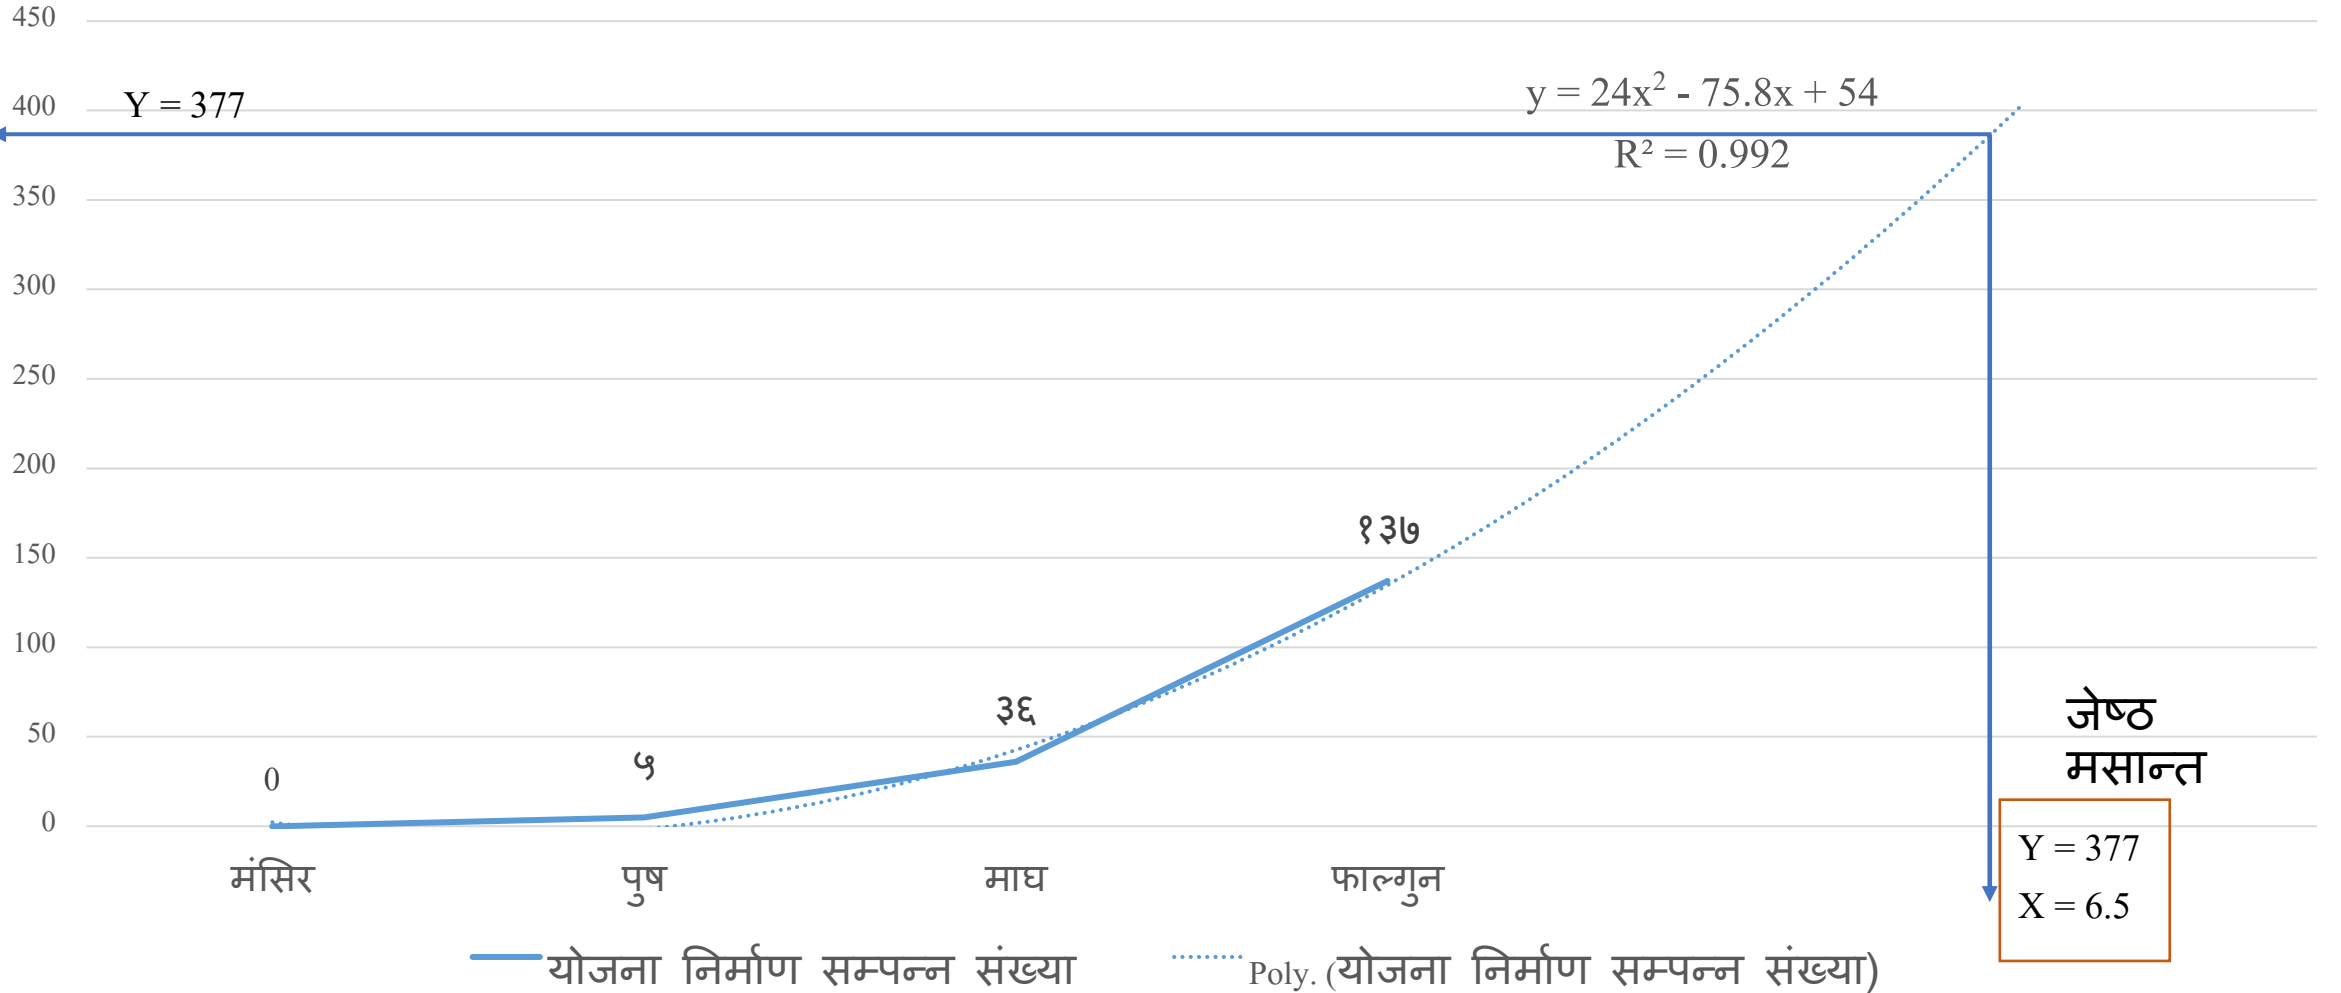

आर्थिक अवस्था

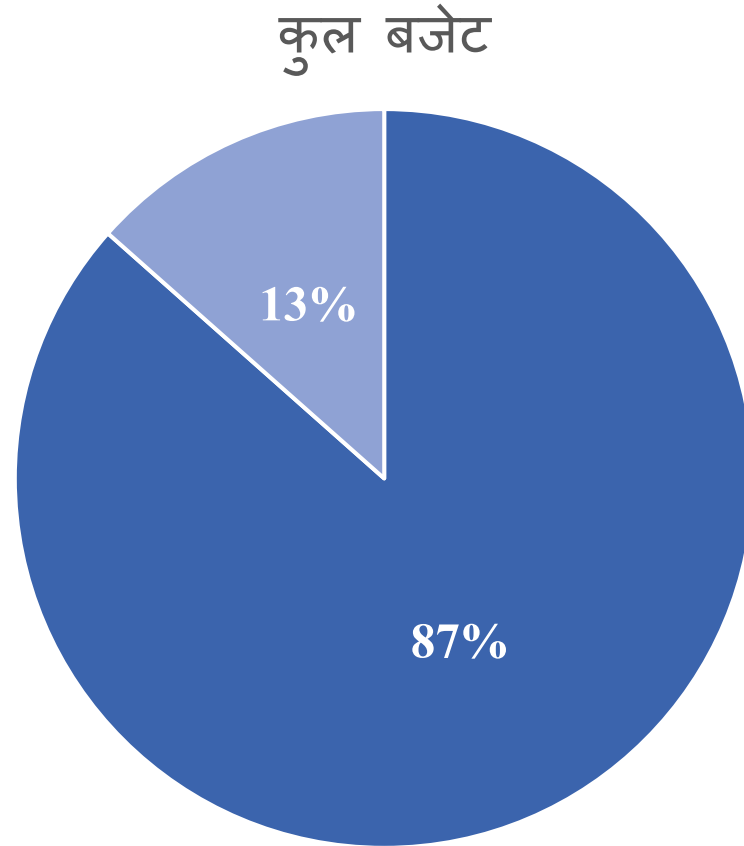


■ बजेट प्रदेश तर्फ ■ बजेट संघ तर्फ

- बजेट प्रदेश तर्फ : ४०९८ लाख
- बजेट संघ तर्फ : ६३७ लाख
- कुल बजेट : ४७३५ लाख

वित्तीय प्रगति


हाल सम्मको खर्च

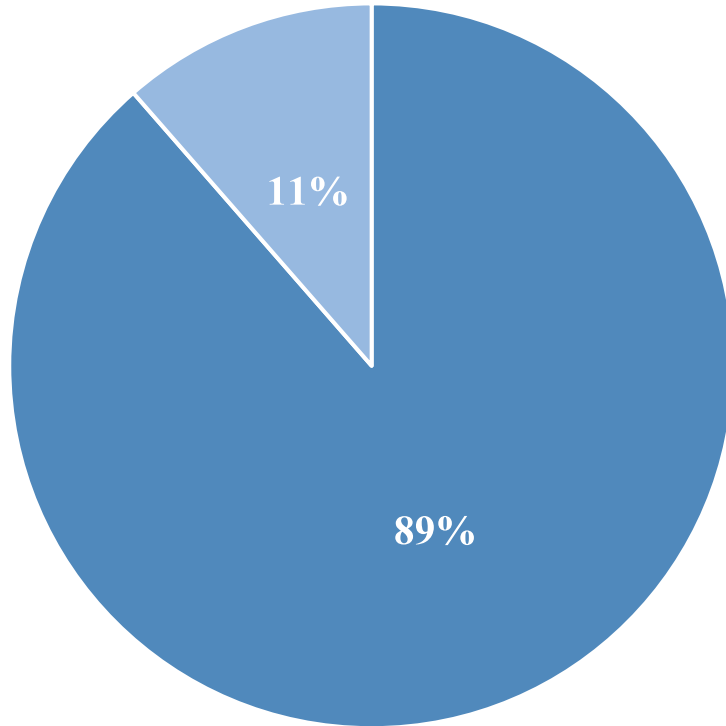


■ हाल सम्मको खर्च प्रदेश तर्फ ■ हाल सम्मको खर्च संघ तर्फ

- फाल्गुन सम्मको खर्च प्रदेश तर्फ : १०५२ लाख
- फाल्गुन सम्मको खर्च प्रदेश तर्फ : १३६ लाख
- फाल्गुन सम्मको कुल खर्च : ११८८ लाख
- फाल्गुन मसान्त सम्मको वित्तीय प्रगति : २५%

बेरुजुको अवस्था



बेरुजुको अवस्था



कर्मचारीको अवस्था

क्र.स.	पद नाम	स्वीकृत दरबन्दी (संख्या)	पदपूर्ती (संख्या)	रिक्त पद (संख्या)
१	सि.डि.ई.	१	१	०
२	इन्जिनियर	२	१	१
३	प्रशासन अधिकृत छैठौं	१	१	०
४	लेखापाल सहायक पाँचौं	१	१	०
५	सब. इन्जिनियर	३	३	०
६	एसोसियसन ओर्गनाइजर	१	१	०
७	कार्यालय सहयोगी	२	२	०

केहि निर्मत संरचनहरु

घट्टेखोला द्वाला सिंचाई योजना, शिखर -१



केहि निर्मत संरचनहरु

पिनार देखि कैनखेत सिंचाई योजना, आदर्श - ७, डोटी



केहि निर्मत संरचनहरु

पानखेत तटबन्धन, डोटी






जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, डोटी



- धन्यवाद
- Thank you
- Danke
- Merci
- Gracias



जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, डोटी
