




सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार  
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय  
जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय  
डोटी


वार्षिक प्रगति समिक्षा ०७९/८०

# स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिमको योजनाहरु

- सिंचाई योजना संख्या : २६७
- नदि नियन्त्रण योजना संख्या : ११०
- जम्मा योजना संख्या : ३७७

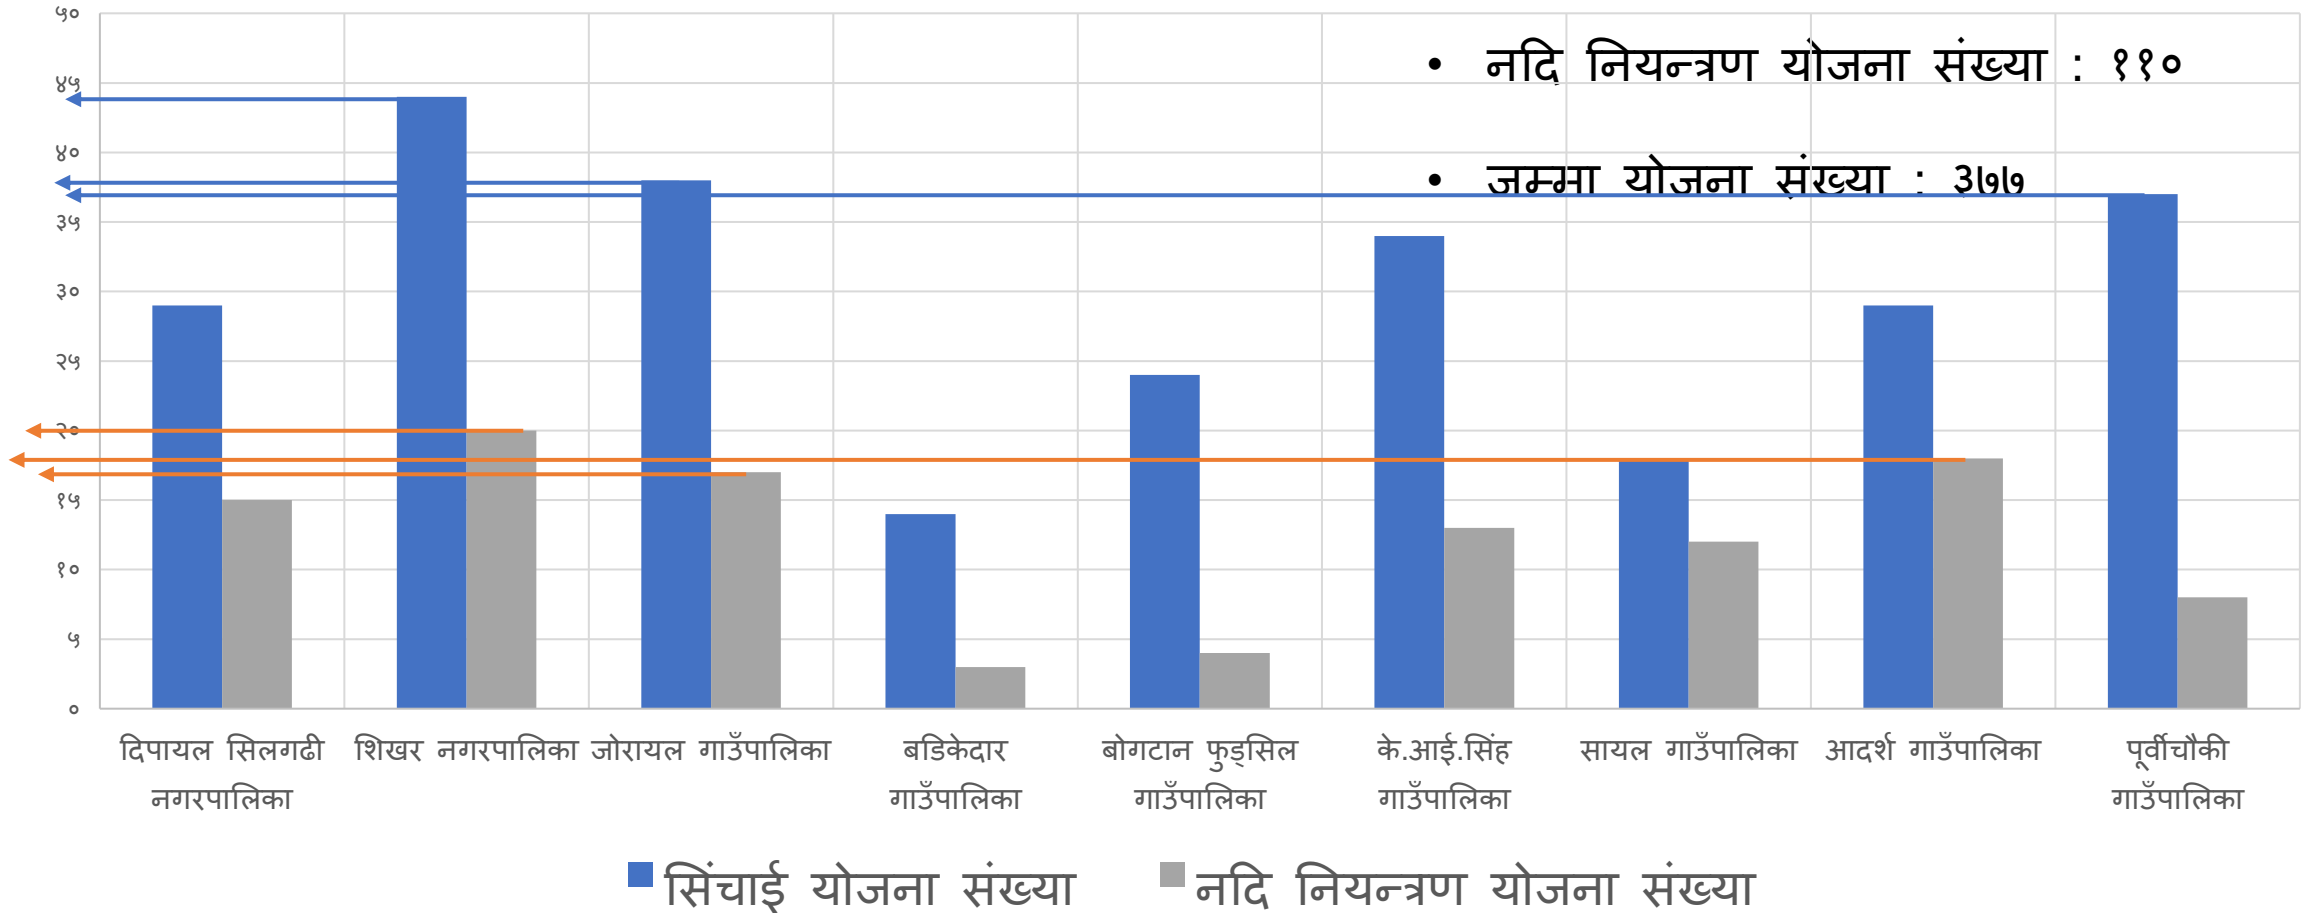


# सिंचाई योजनाहरू

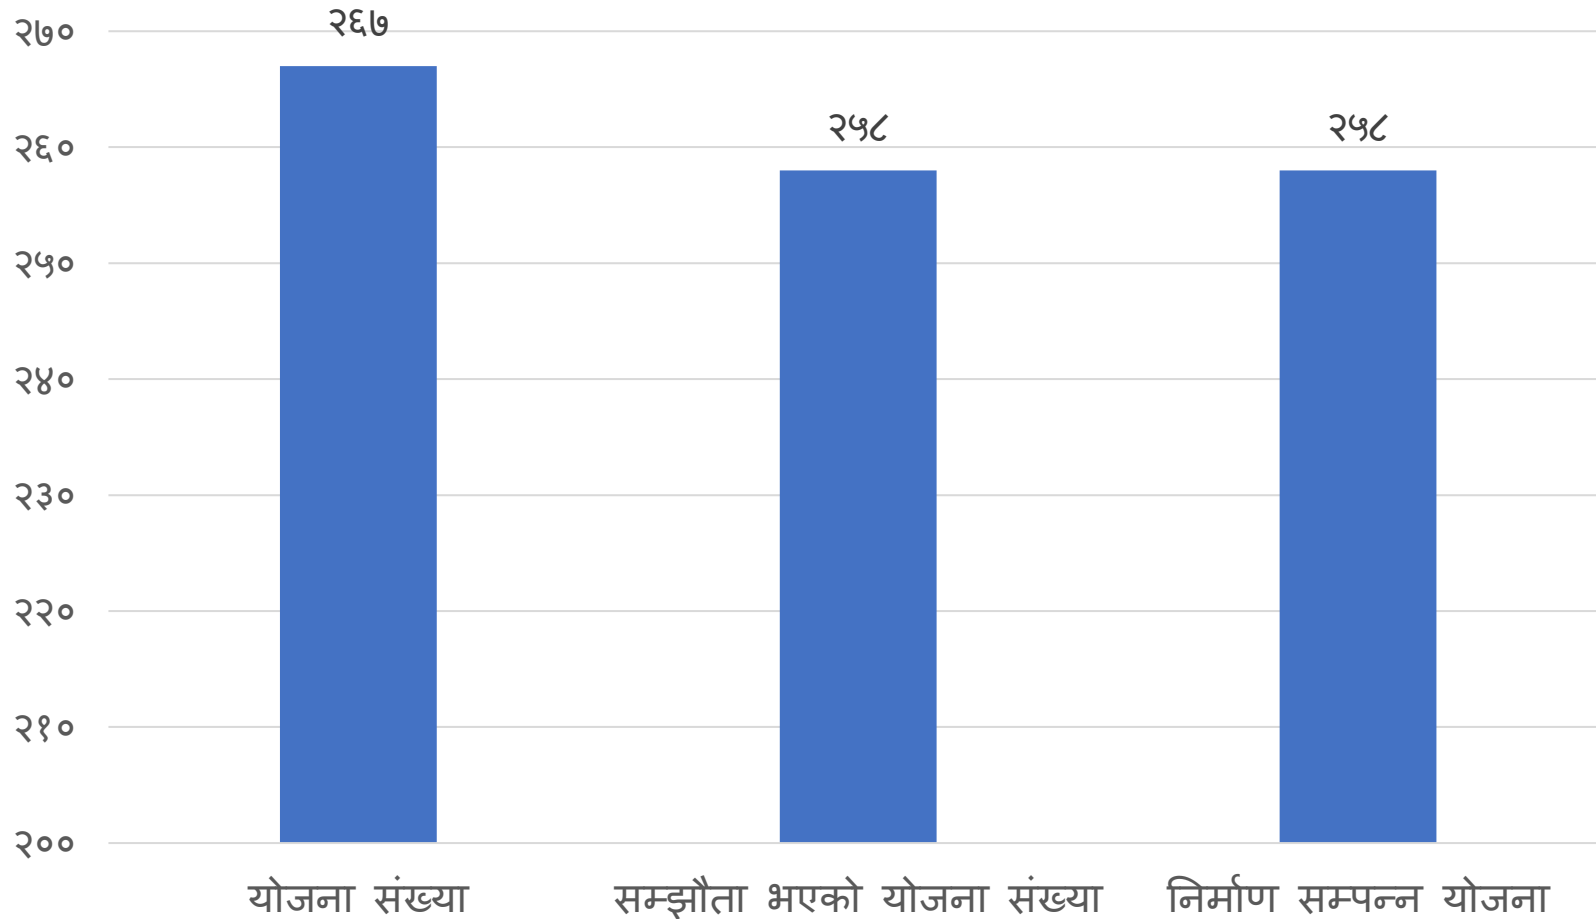


- सम्झौता हुन बाकी योजना : 3%
- सम्झौता भएको : 96%
- निर्माण सम्पन्न योजना : 100%

# सिंचाई योजनाहरूका उपलब्धि

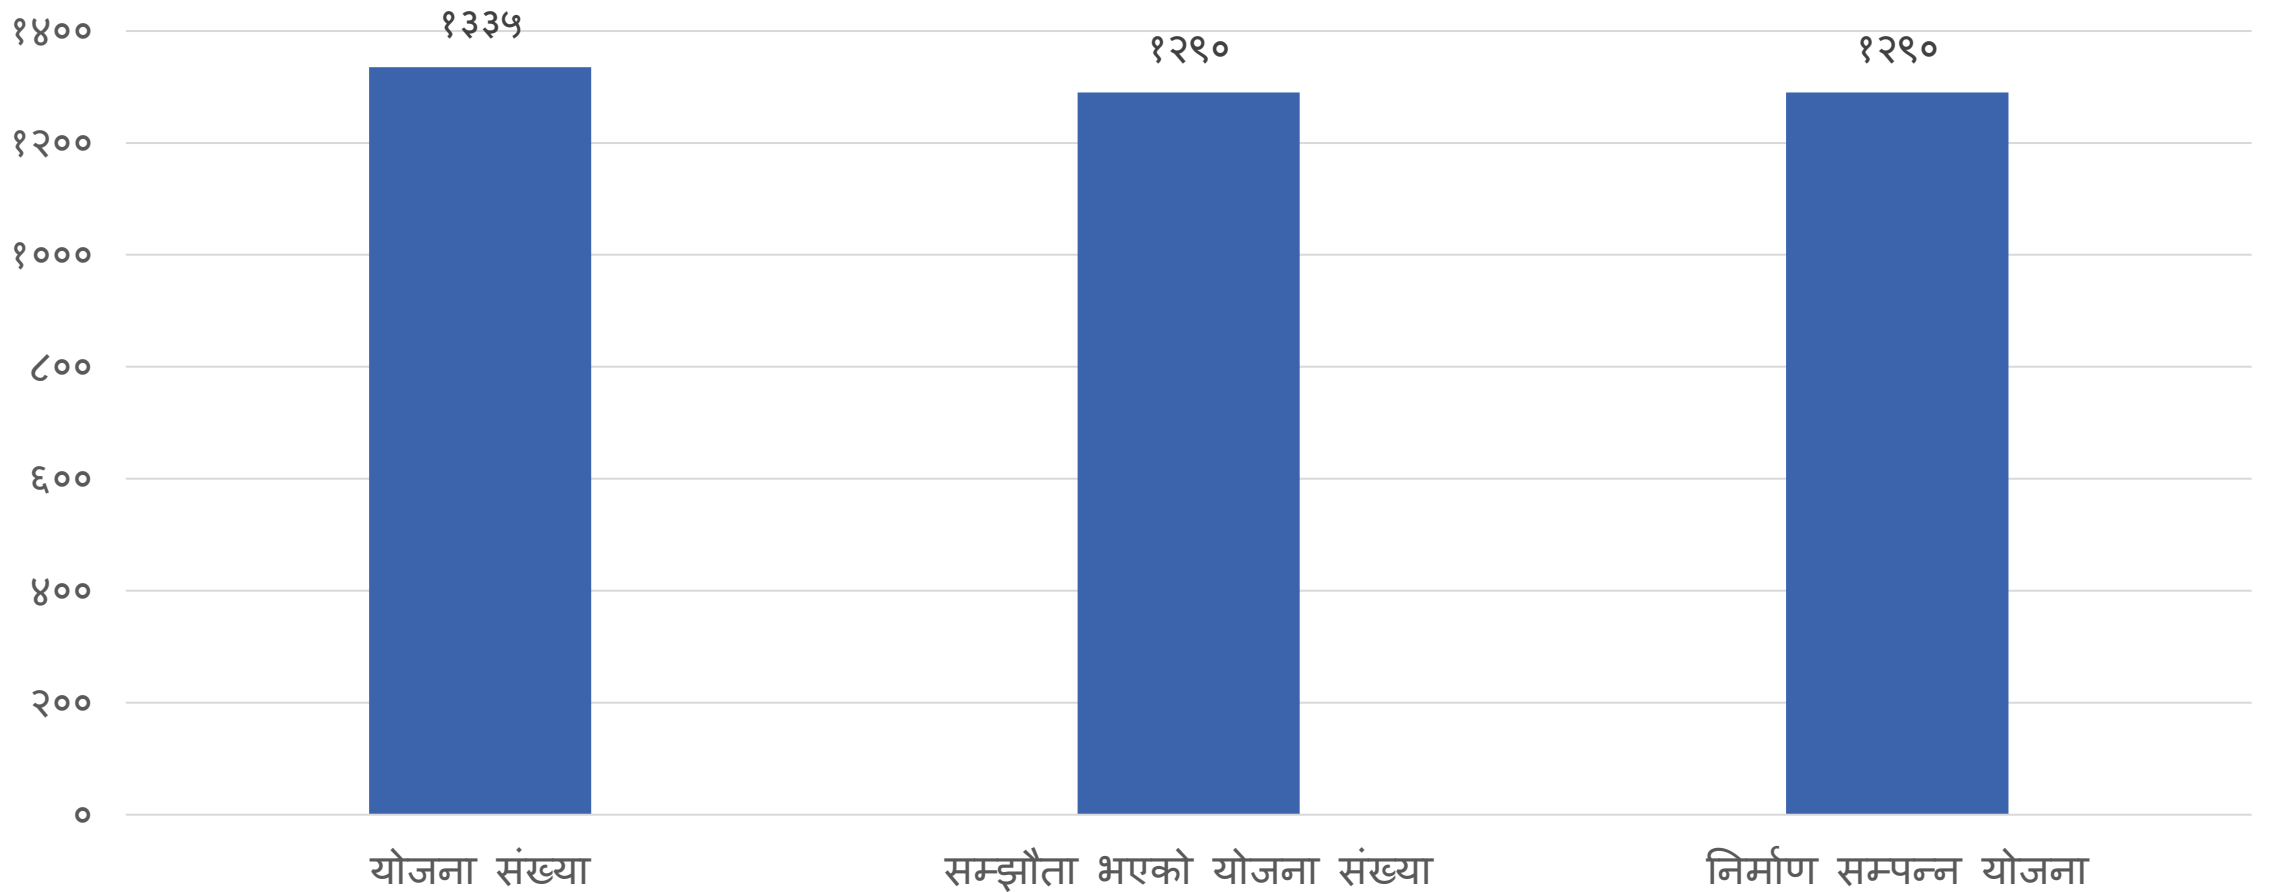


एकाई : हेक्टर

# नदि नियन्त्रण योजनाहरू

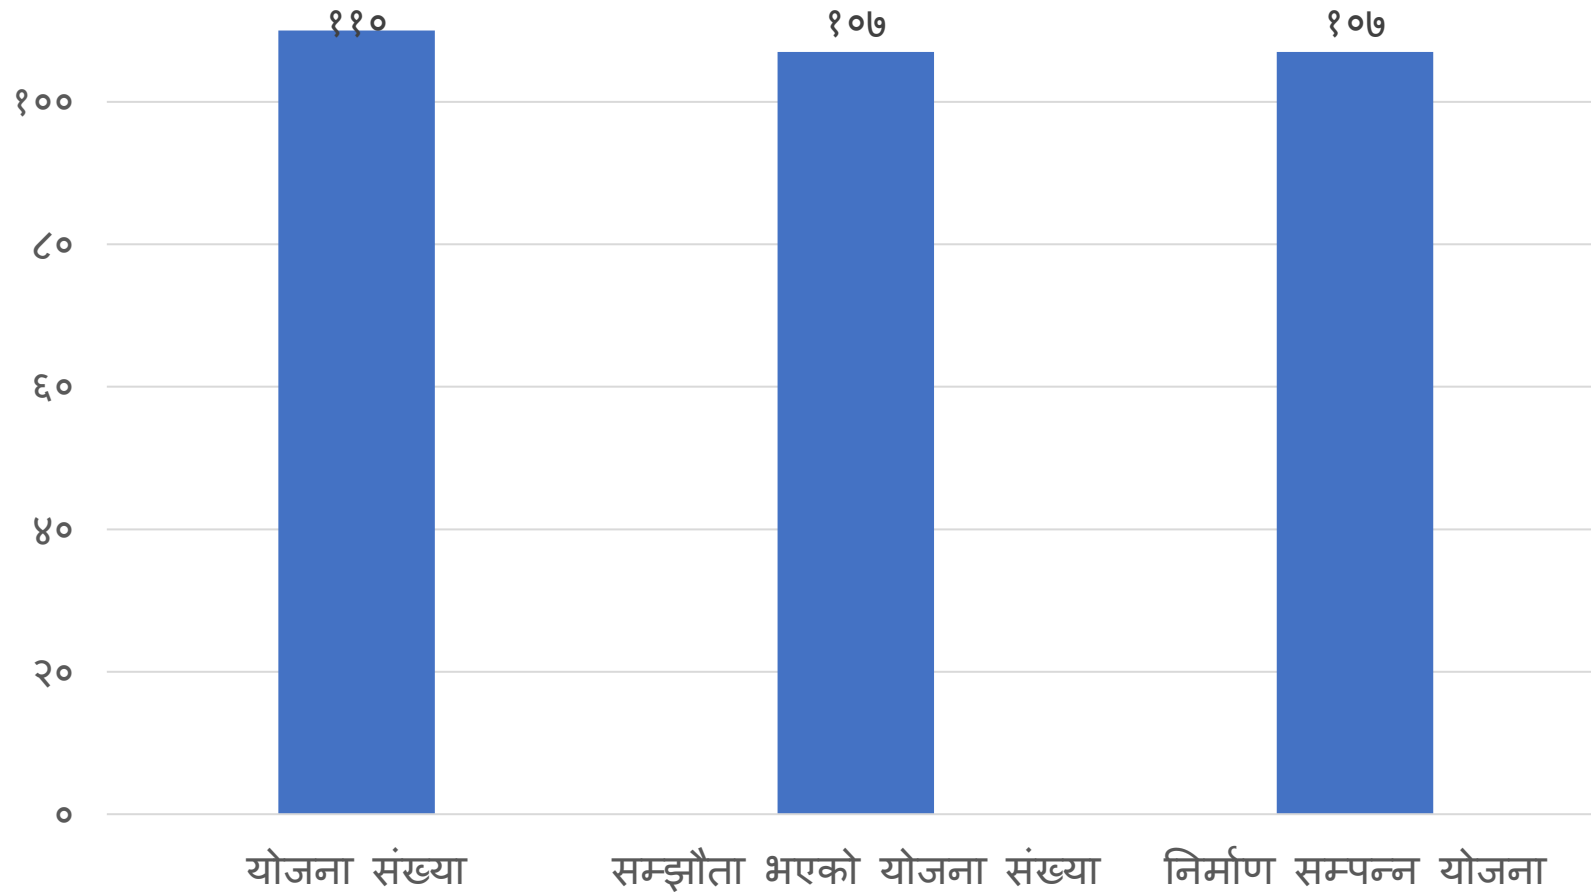


- सम्झौता हुन बाकी योजना : ३%
- सम्झौता भएको : ९७%
- निर्माण सम्पन्न योजना : १००%

# नदि नियन्त्रण अन्तर्गत भएका कार्य

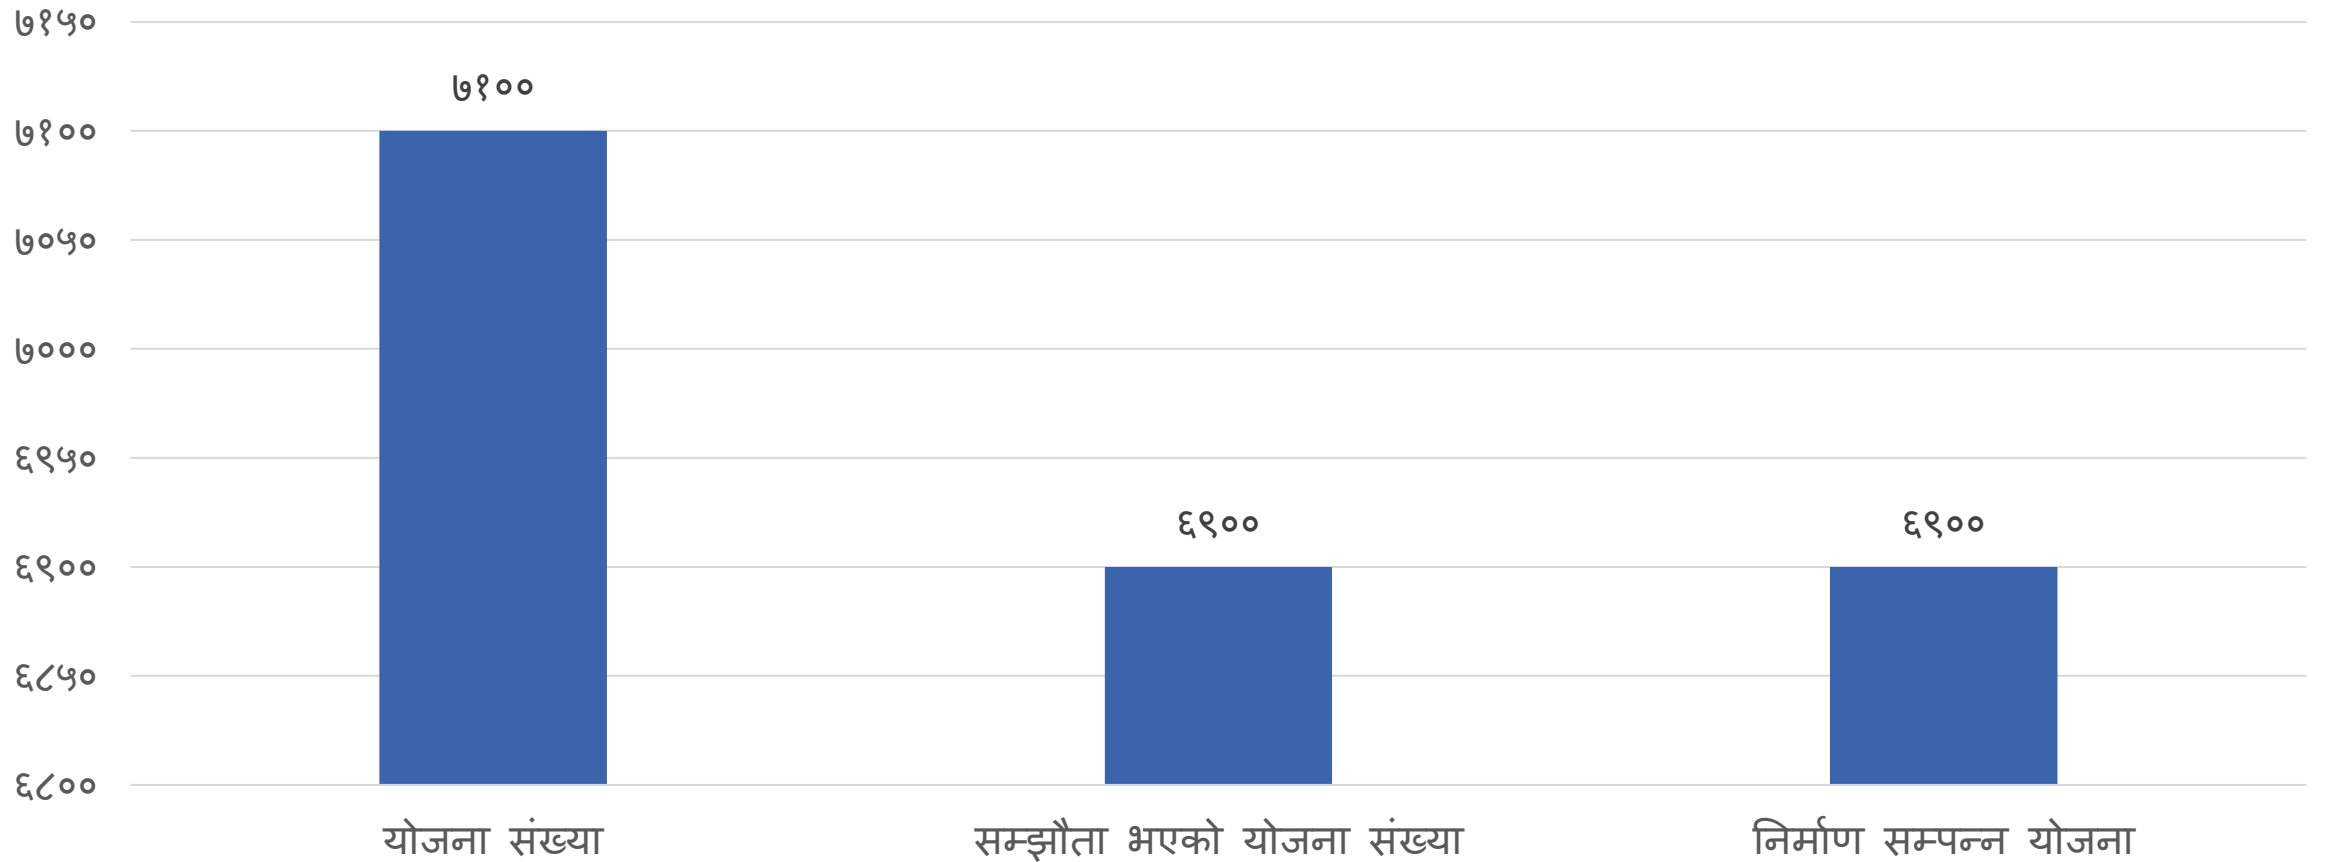

एकाई : मिटर


# नदि नियन्त्रण अन्तर्गत भएका कार्य

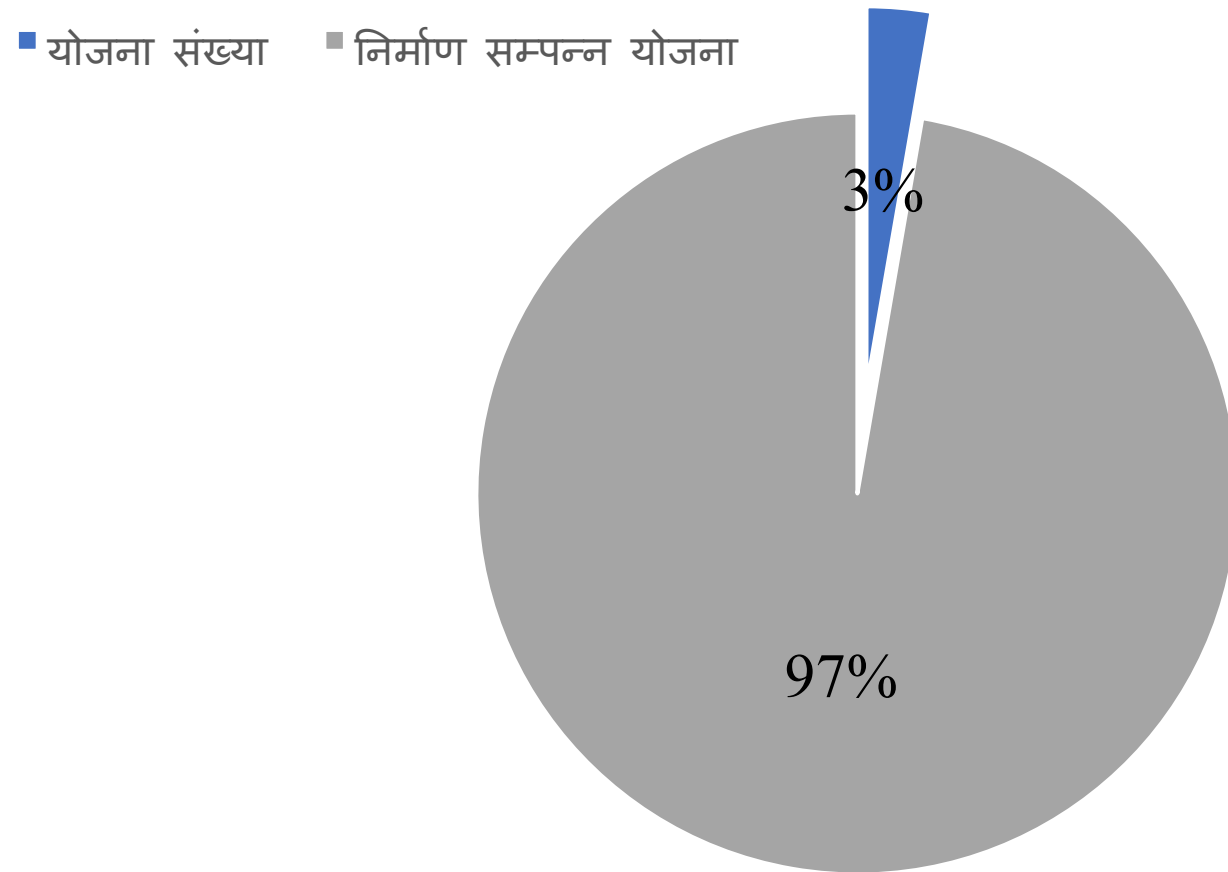

- लक्षित क्षेत्रफल: २२० हे
- नदि नियन्त्रण गरिएको क्षेत्र : २१४ हे

एकाई : हेक्टर

# जलबिद्युत योजना

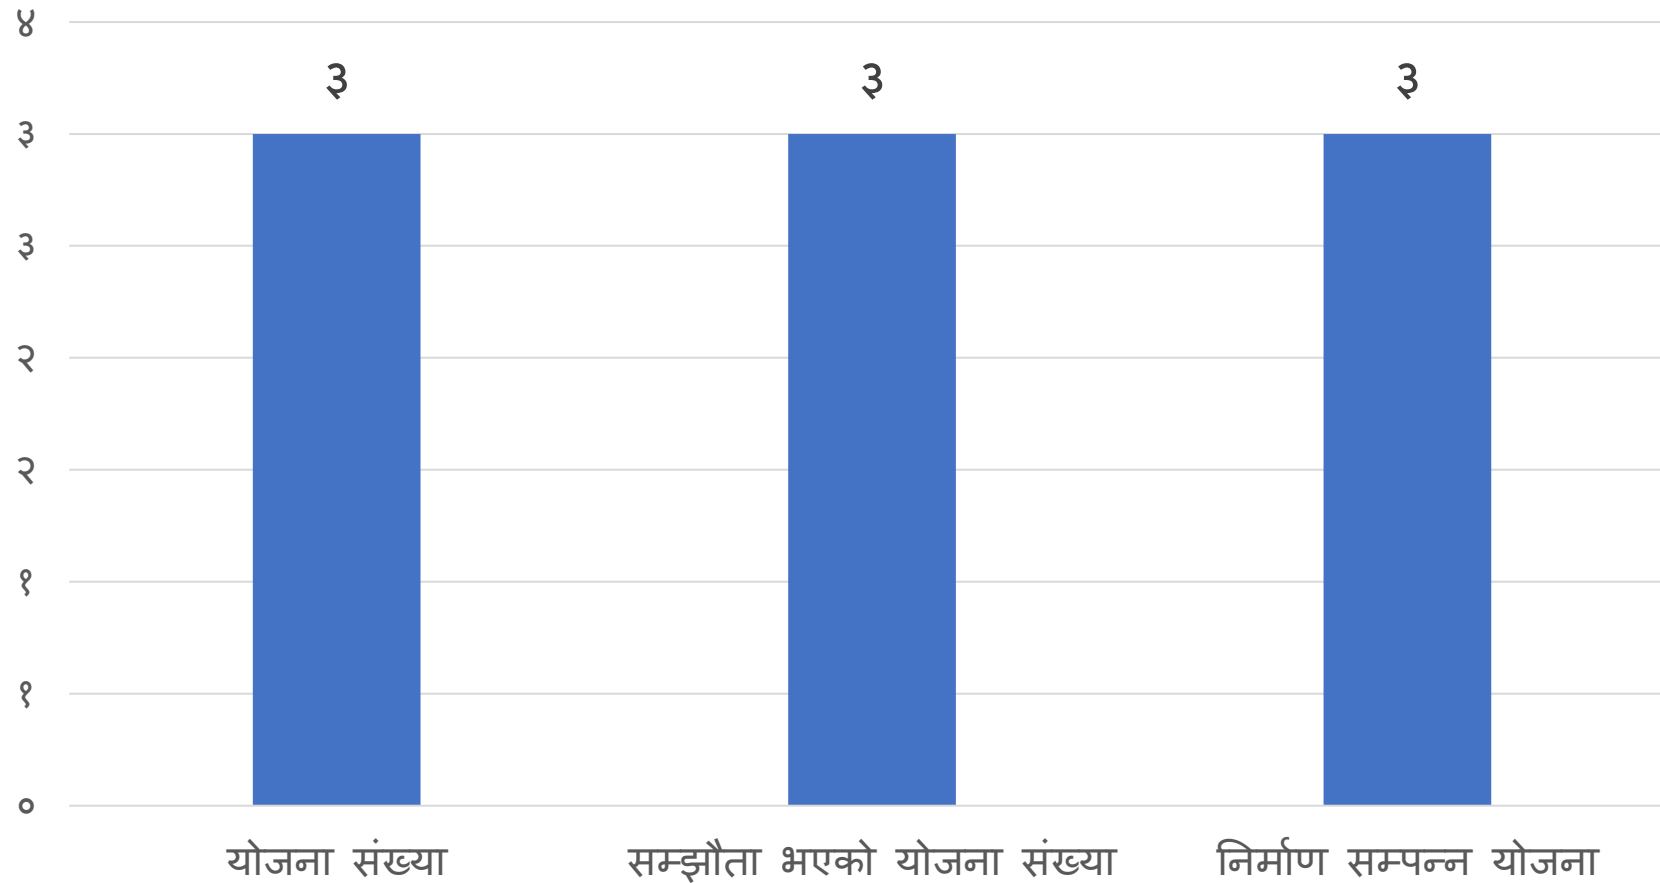


- योजना संख्या : 3
- कुल क्षेमता: २१५ KW

एकाई : KW




# निर्माण सम्पन्न योजनाहरूको विवरण

- कुल सिंचाई योजना संख्या : २६९
- जम्मा निर्मित योजना संख्या : २५८

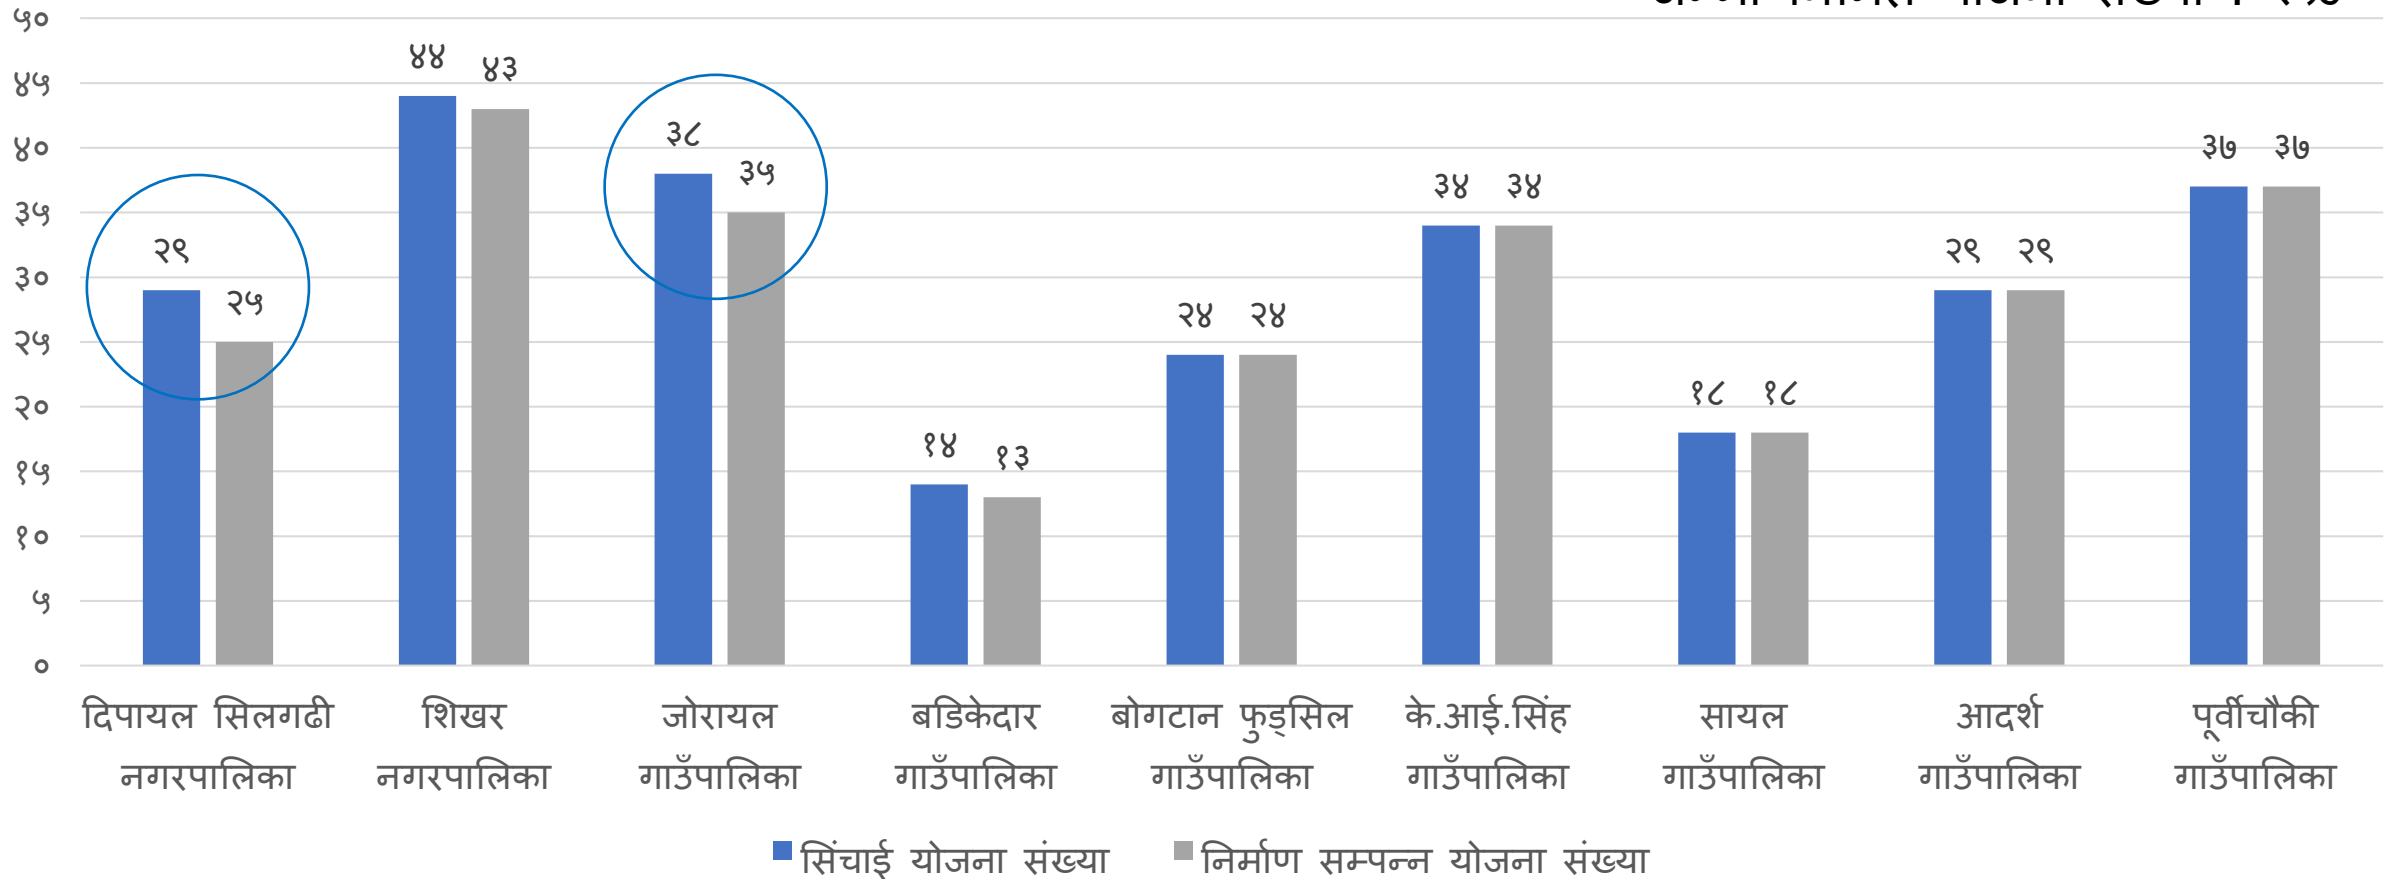


# निर्माण सम्पन्न योजनाहरूको विवरण

- कुल निद नियन्त्रण योजना संख्या : ११०
- जम्मा निर्मित योजना संख्या : १०७

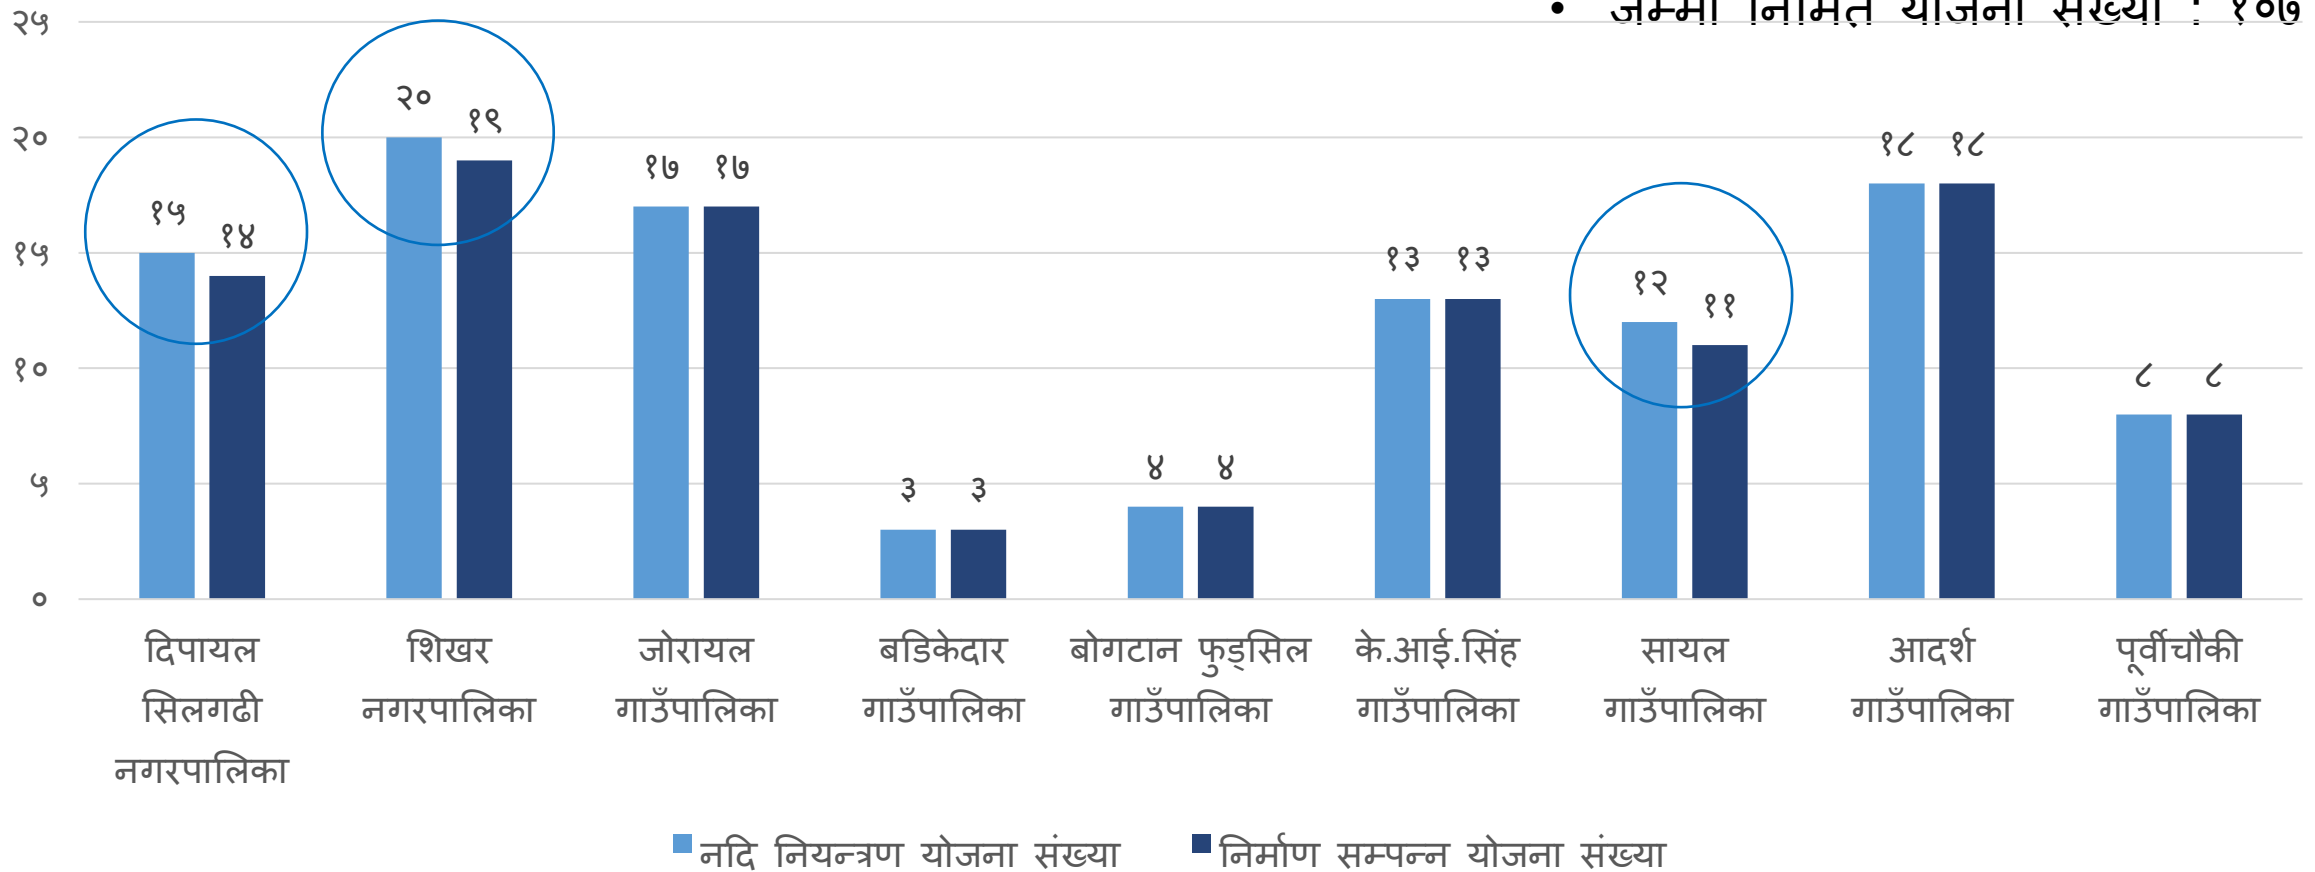


# योजना समझौता ट्रेन्ड फाल्गुन मसान्त सम्म


योजना समझौता संख्या

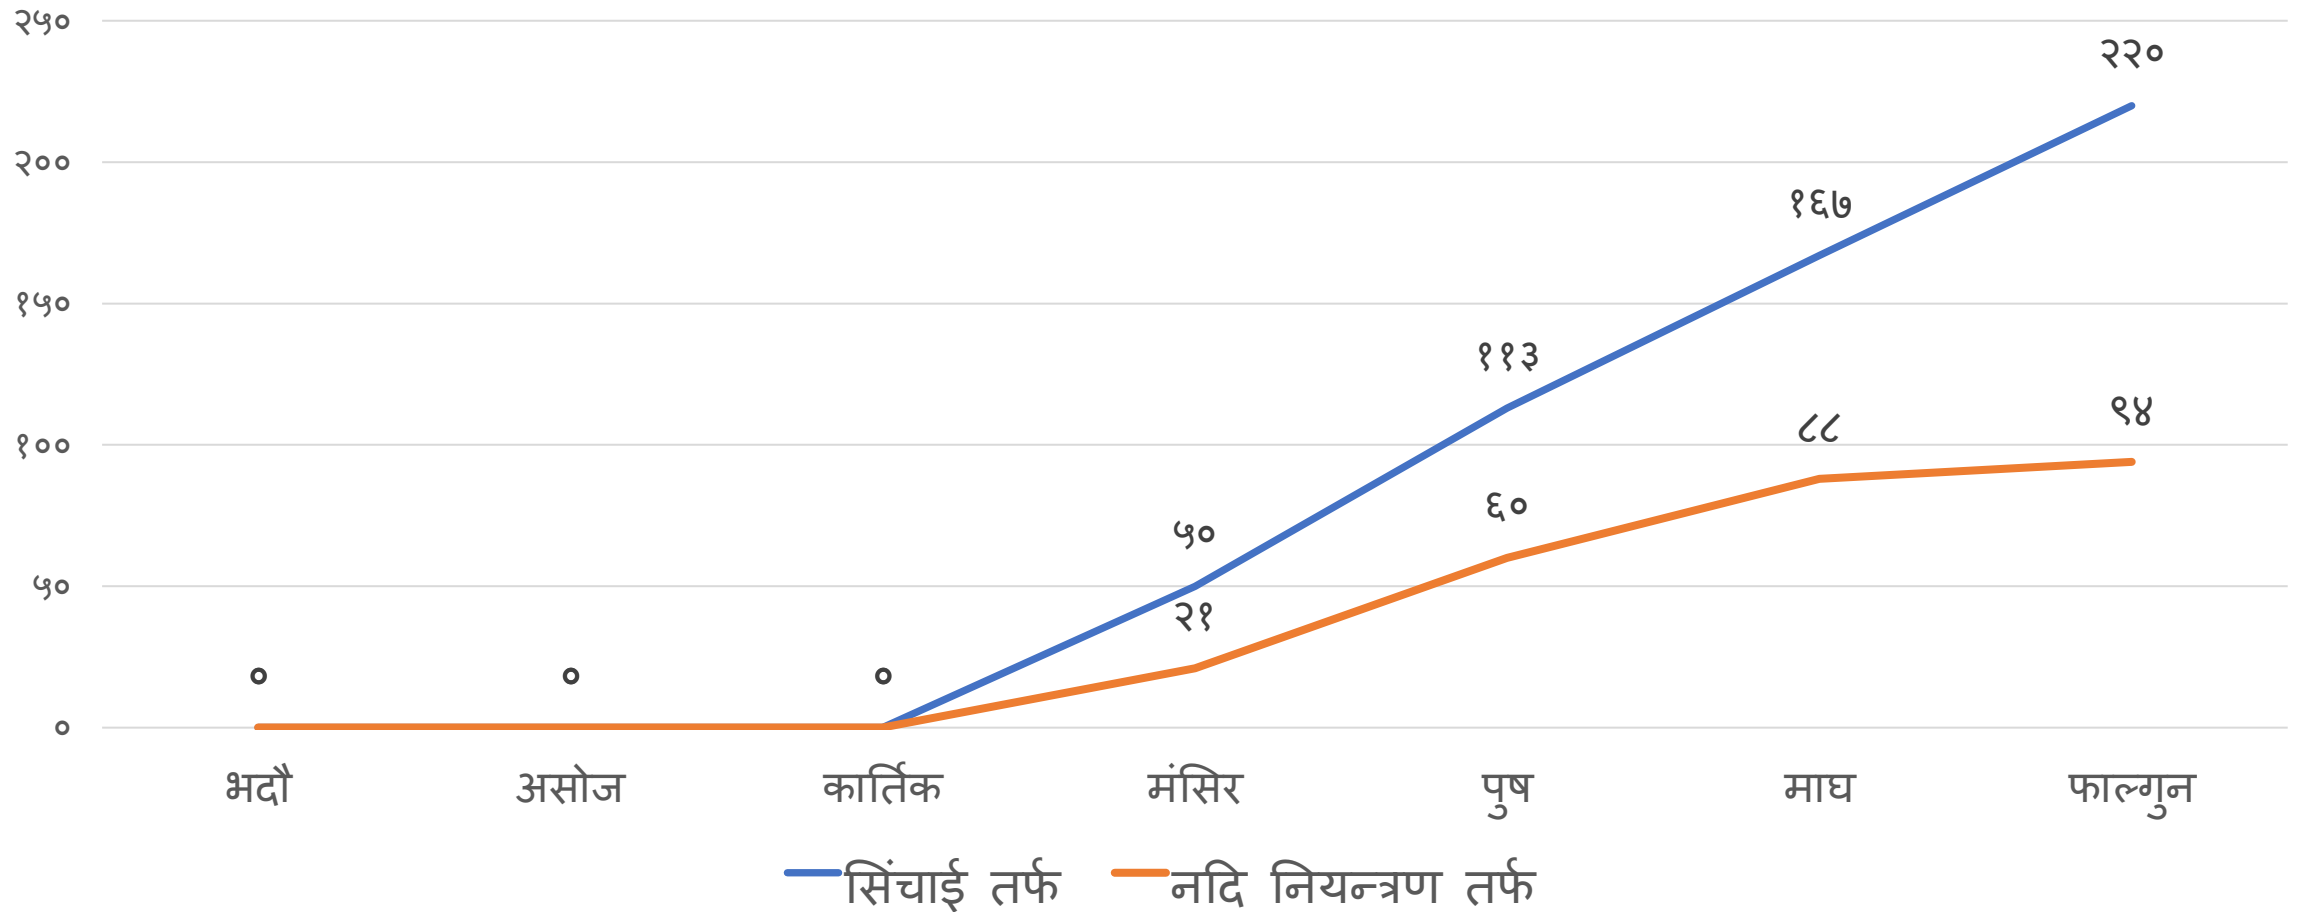


# योजना निर्माण ट्रेन्ड फाल्गुन मसान्त सम्म

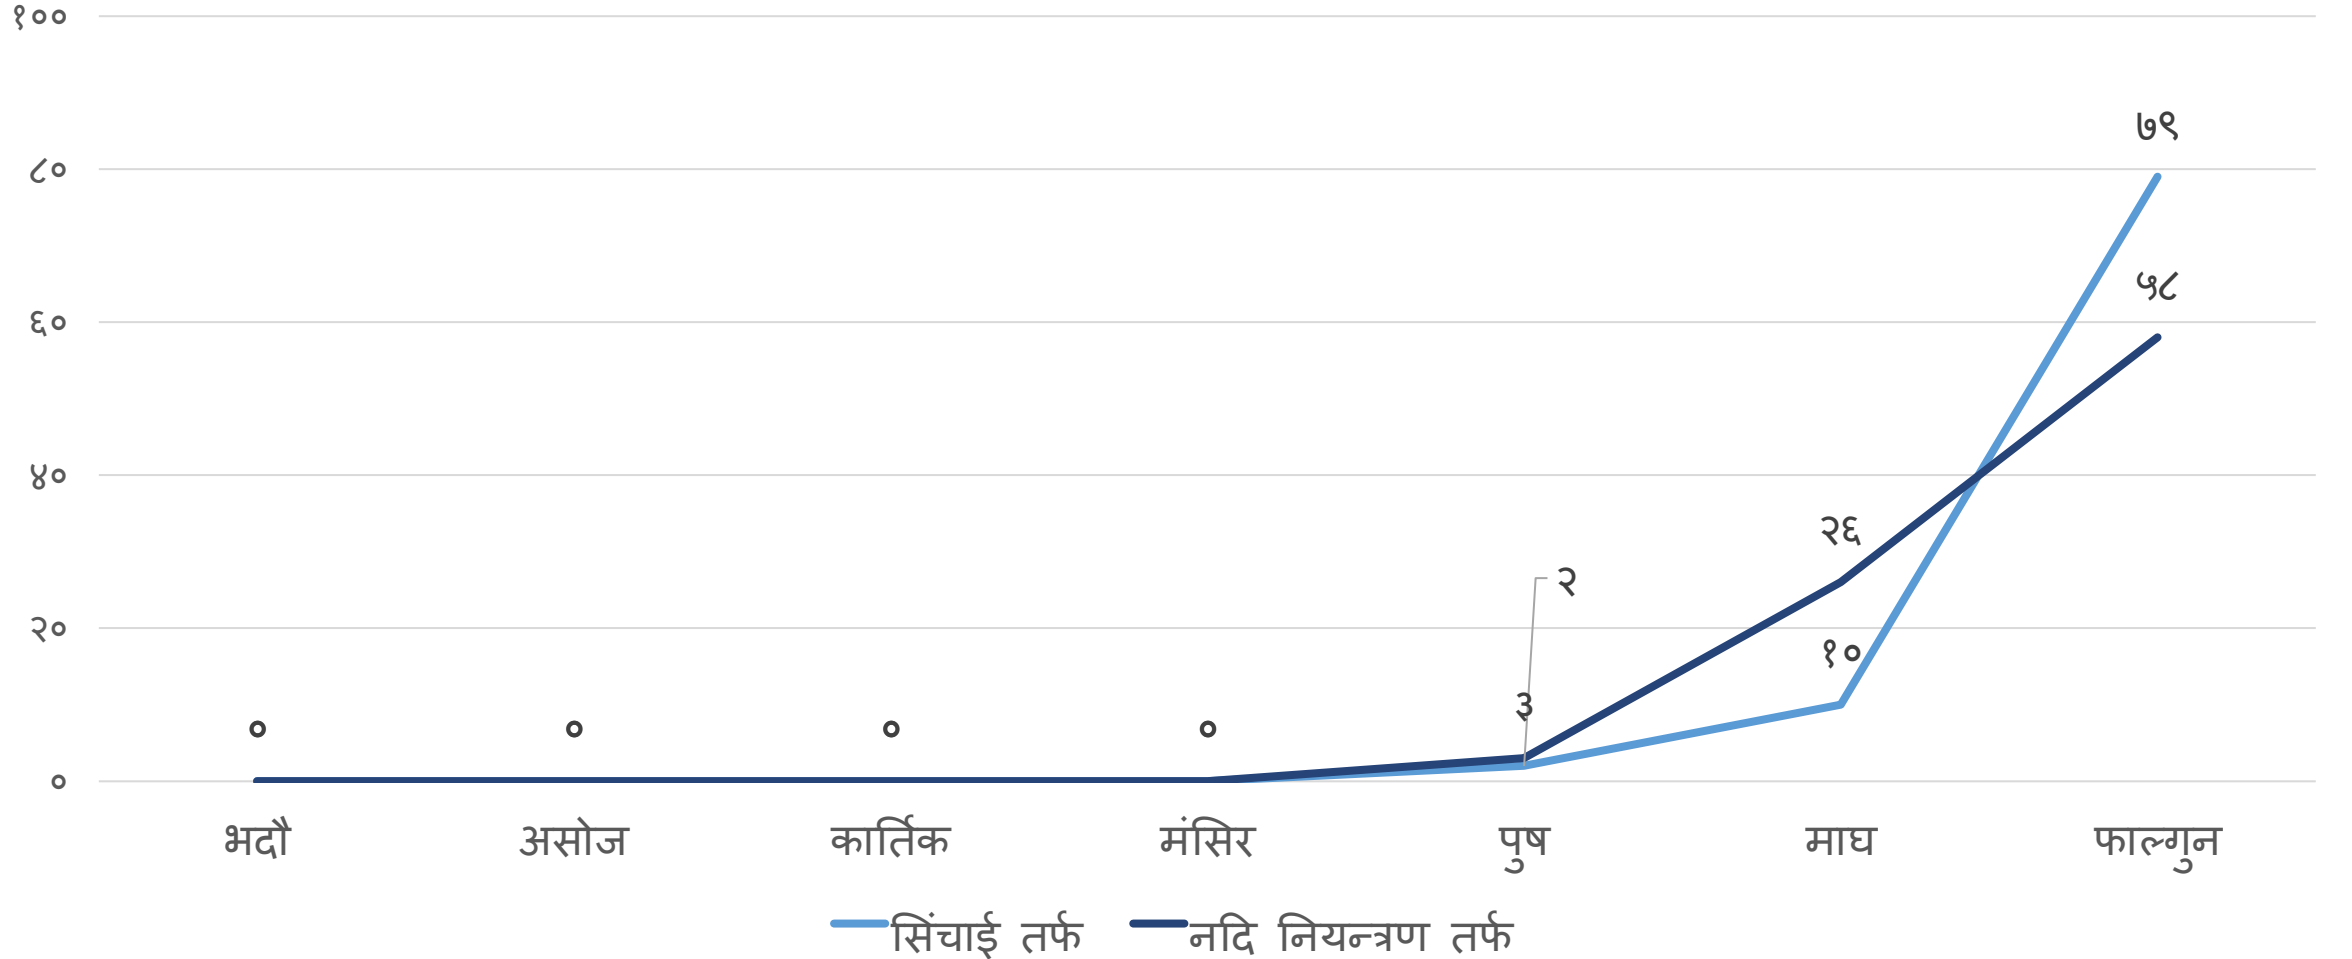


# योजना निर्माण ट्रेन्ड (Predicted)

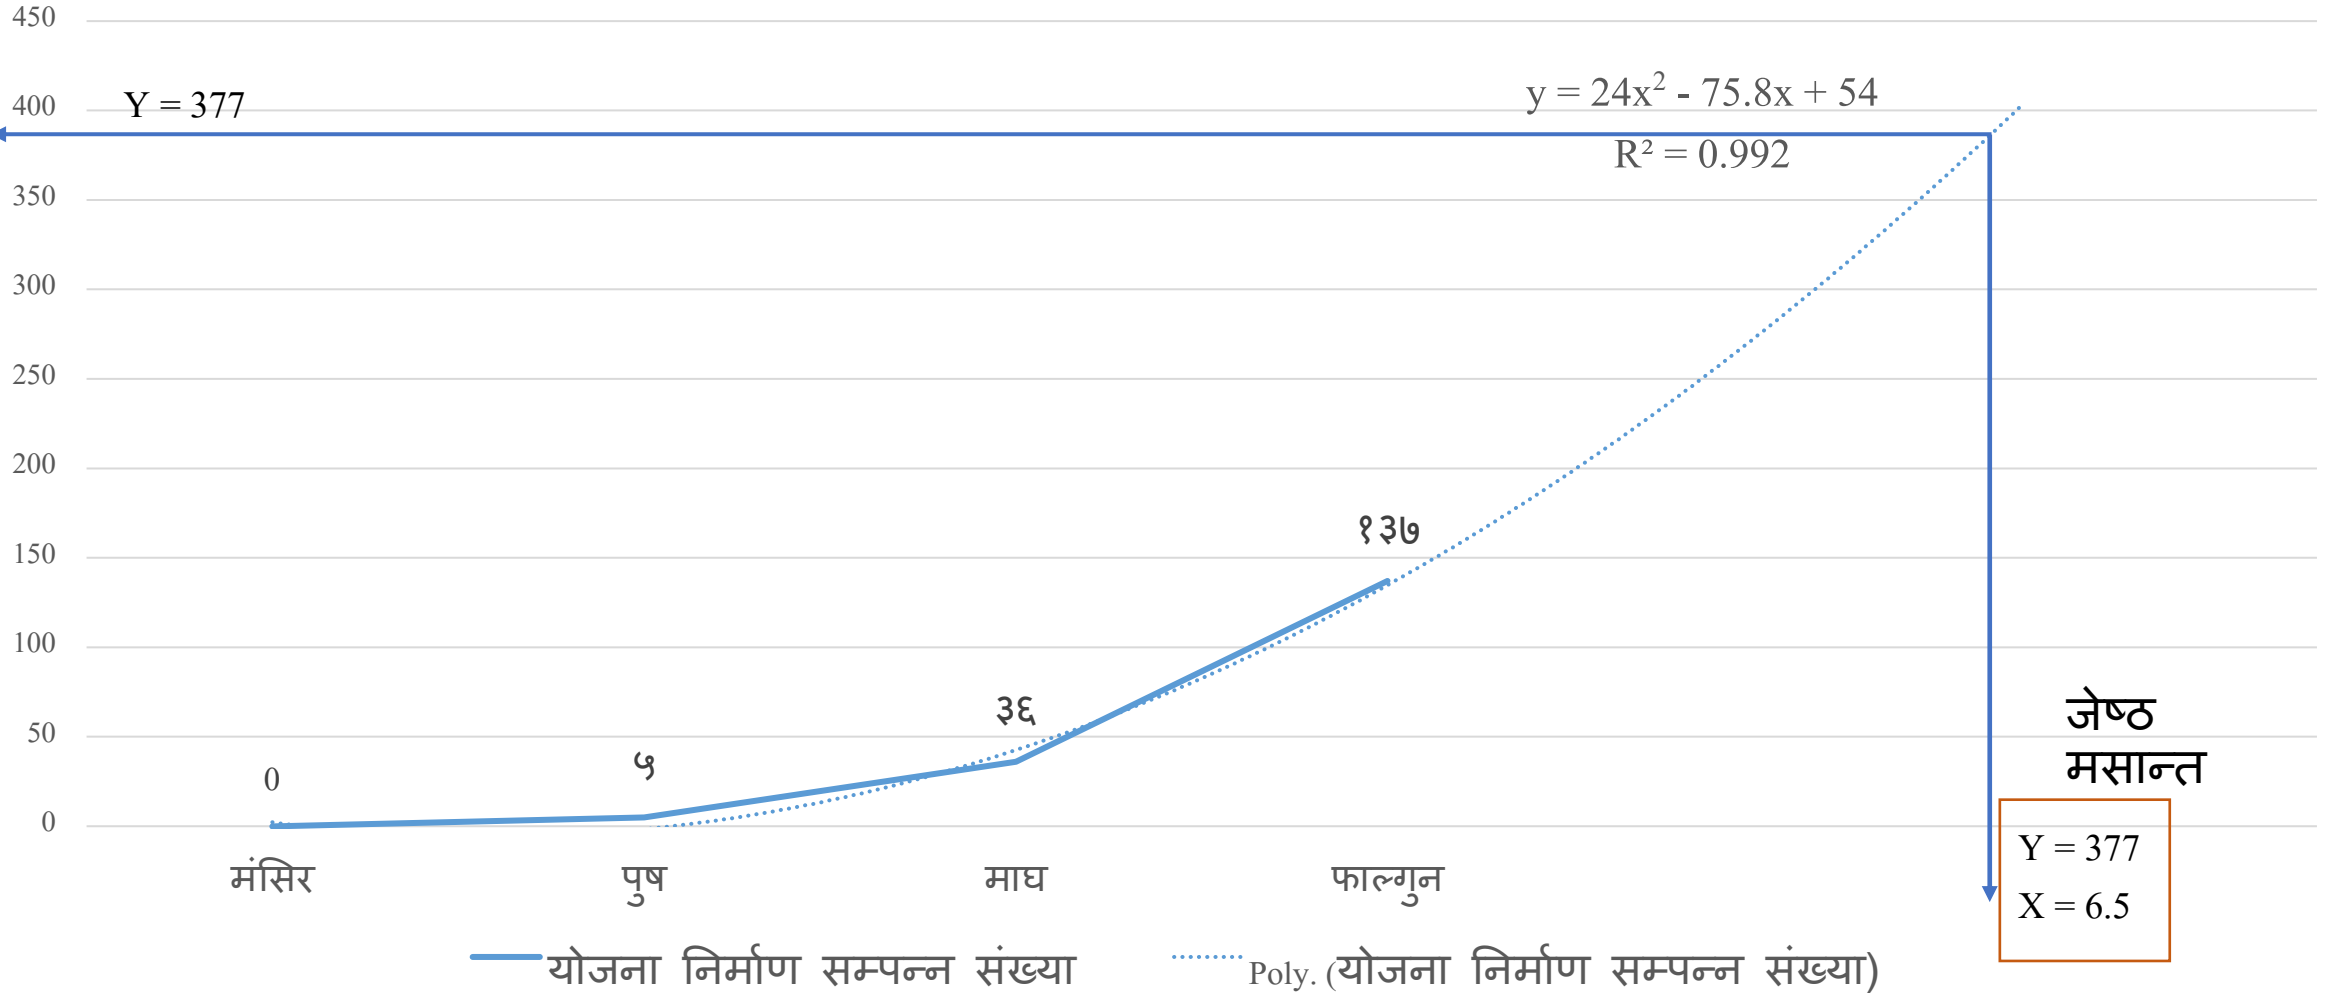

# योजना सम्झौता ट्रेन्ड (Actual)

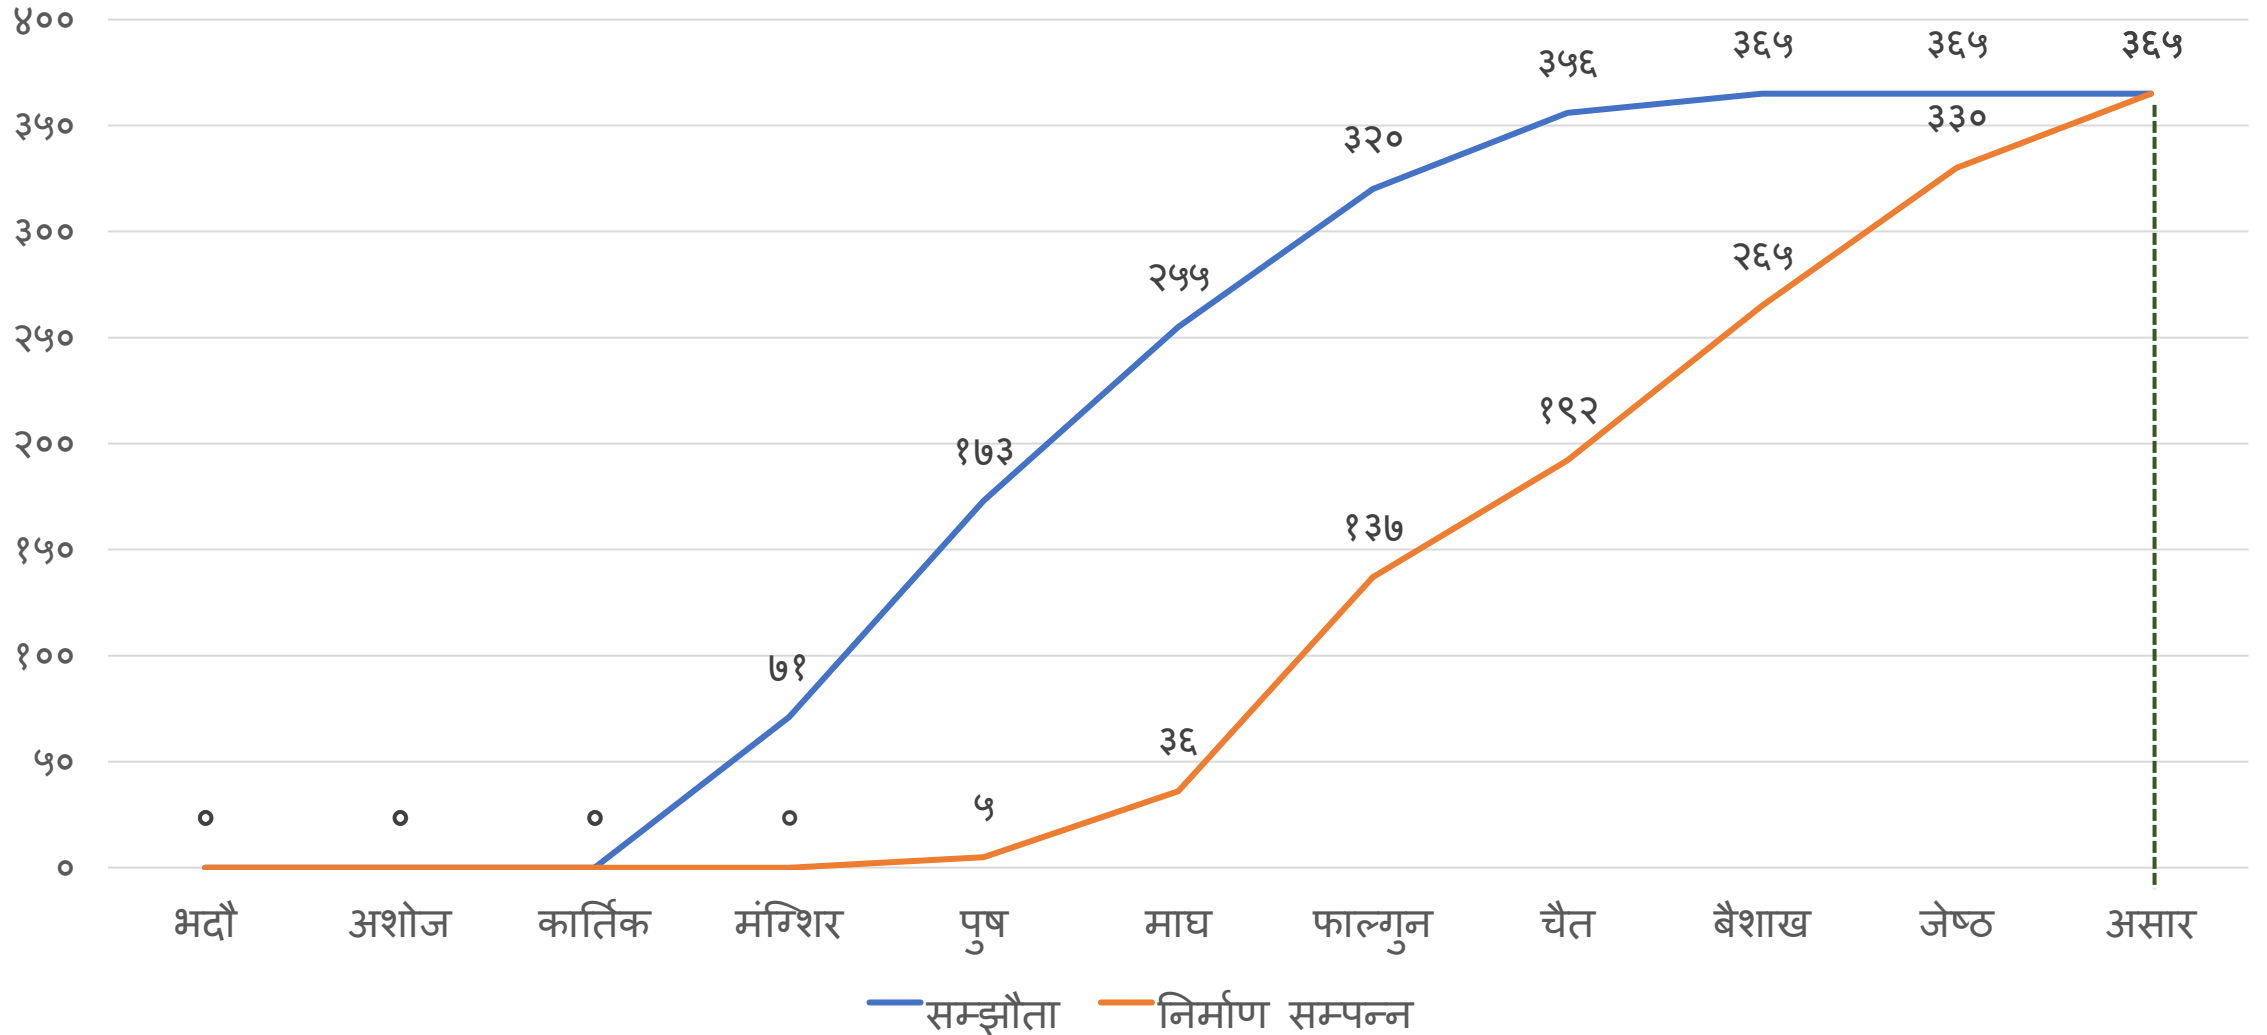


# वित्तीय अवस्था



- बजेट प्रदेश तर्फ : ४२२८.२१ लाख
- बजेट संघ तर्फ : ६३७ लाख
- कुल बजेट : ४८६५.२१ लाख

# वित्तीय प्रगति फाल्गुन सम्म

हाल सम्मको खर्च

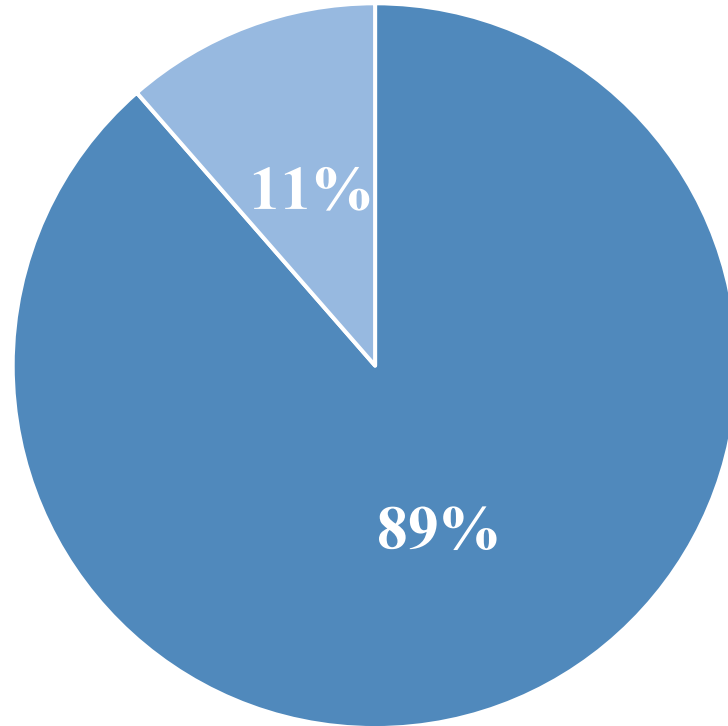


■ हाल सम्मको खर्च प्रदेश तर्फ    ■ हाल सम्मको खर्च संघ तर्फ

- फाल्गुन सम्मको खर्च प्रदेश तर्फ : १०५२ लाख
- फाल्गुन सम्मको खर्च प्रदेश तर्फ : १३६ लाख
- फाल्गुन सम्मको कुल खर्च : ११८८ लाख
- फाल्गुन मसान्त सम्मको वित्तीय प्रगति : २५%




# वित्तीय प्रगति असार मसान्त सम्म




■ खर्च प्रदेश तर्फ ■ खर्च संघ तर्फ

- खर्च प्रदेश तर्फ : ३८४० लाख
- खर्च प्रदेश तर्फ : ५३३ लाख
- कुल खर्च : ४३७३ लाख
- वित्तीय प्रगति : ८९.८९%

# बेरुजुको अवस्था

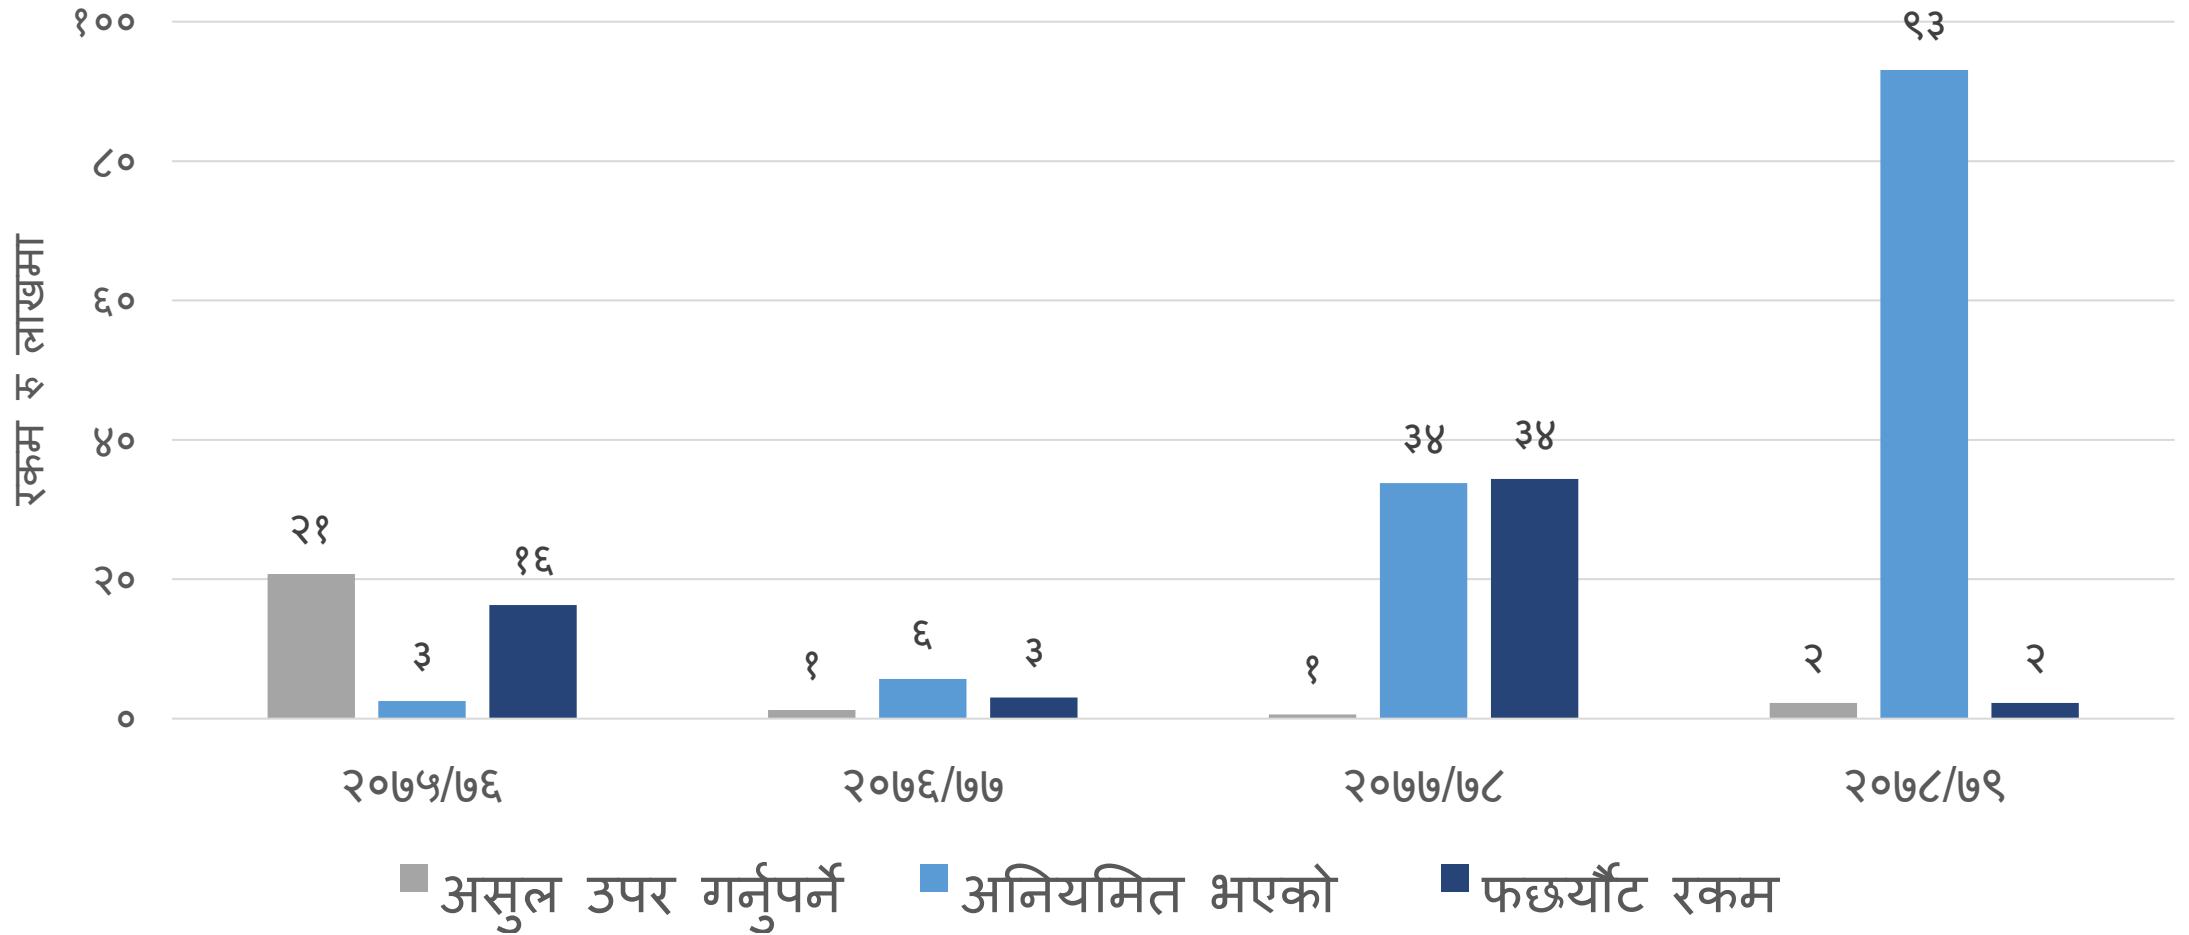

# बेरुजुको अवस्था

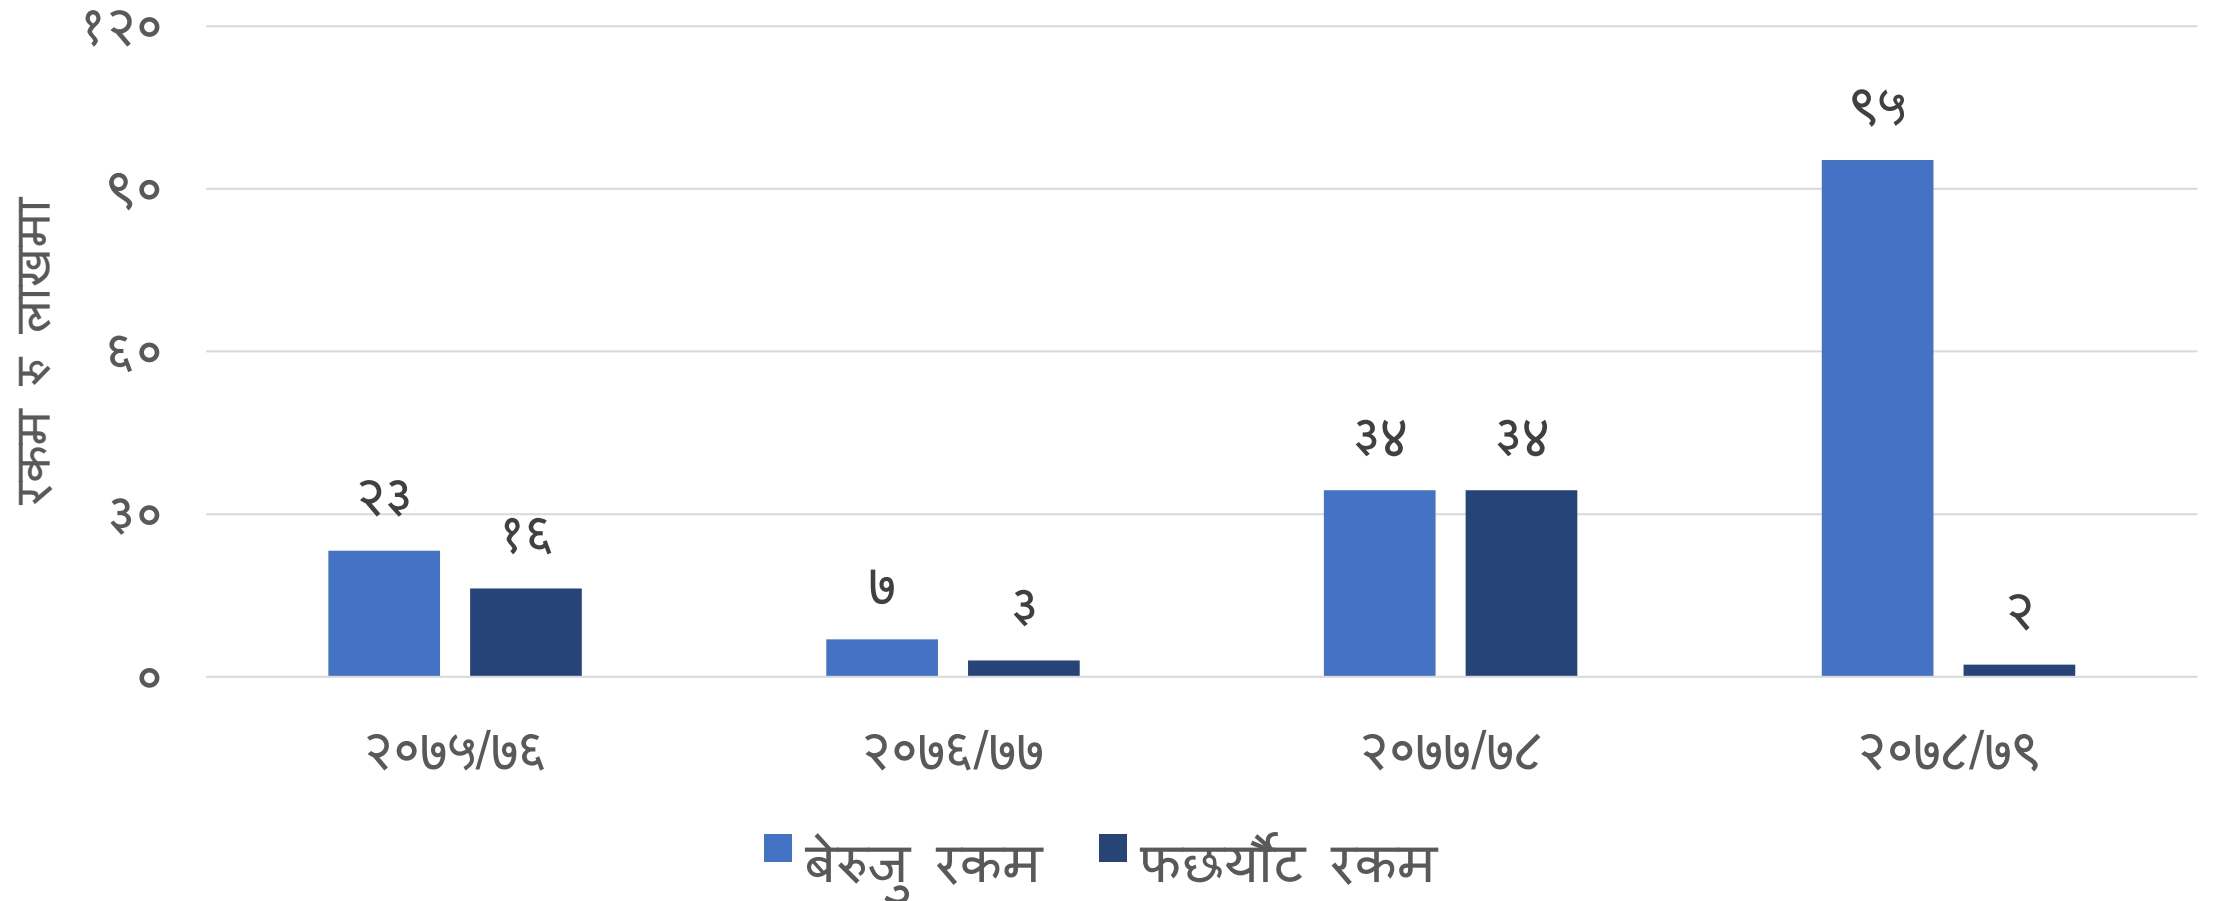

# कर्मचारीको अवस्था

क्र.स.	पद नाम	स्वीकृत दरबन्दी (संख्या)	पदपूर्ती (संख्या)	रिक्त पद (संख्या)
१	सि.डि.ई.	१	१	०
२	इन्जिनियर	२	१	१
३	प्रशासन अधिकृत छैठौं	१	१	०
४	लेखापाल सहायक पाँचौं	१	१	०
५	सब. इन्जिनियर	३	३	०
६	एसोसियसन ओर्गनाइजर	१	१	०
७	कार्यालय सहयोगी	२	२	०

# केहि निर्मत संरचनहरु

घट्टेखोला द्वाला सिंचाई योजना, शिखर -१



# केहि निर्मत संरचनहरु

पिनार देखि कैनखेत सिंचाई योजना, आदर्श - ७, डोटी



# केहि निर्मत संरचनहरु

पानखेत तटबन्धन, डोटी






जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, डोटी

- धन्यवाद
- Thank you
- Danke
- Merci
- Gracias

<https://wriddodoti.gov.np/>

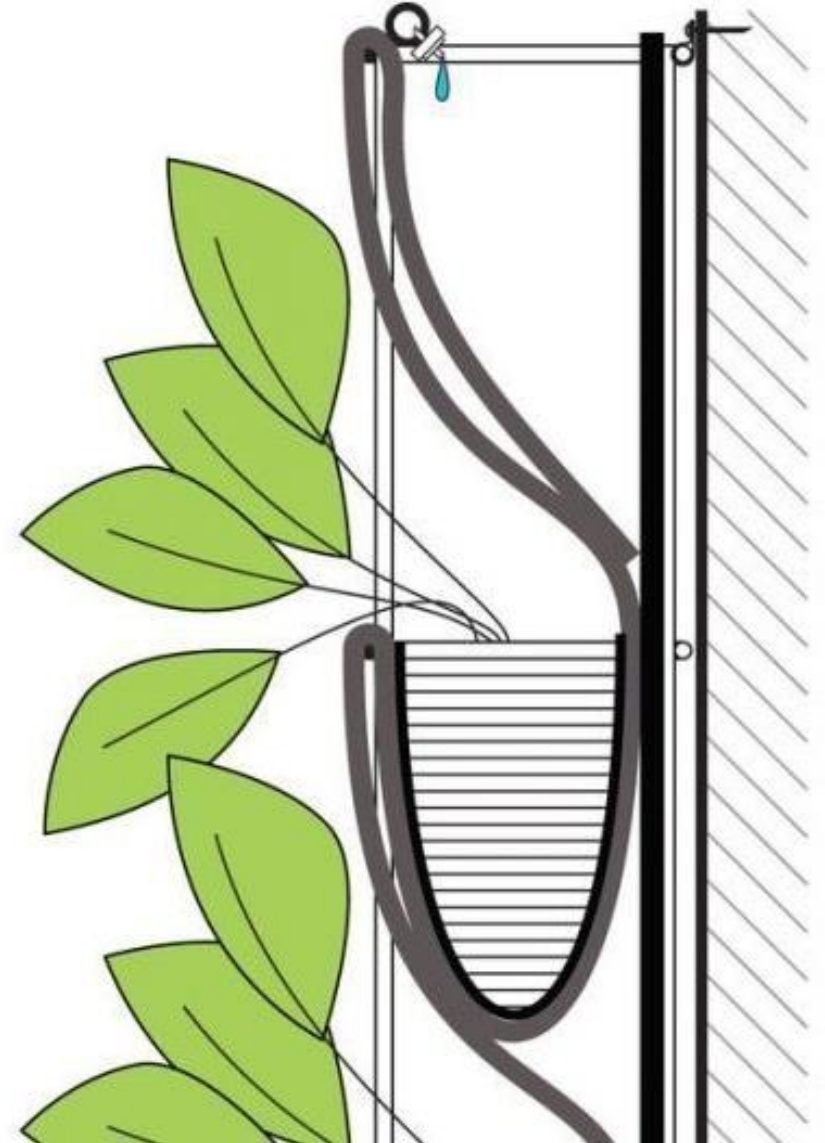

जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, डोटी
